

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

BEYKOZ ANADOLU LİSESİ

ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI

AĞUSTOS 2026

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

İçindekiler

Ekler Listesi.....	3
Tablo Listesi.....	3
Şekil Listesi	3
Kısaltmalar	4
1. Özet	6
2. Giriş.....	8
3. Hukuki ve Kurumsal Çerçeve	9
4. Genel Proje ve Proje Alanı Bilgileri.....	10
4.1 Proje Tanımı.....	10
4.2 Genel Bilgiler ve Amaçlar.....	10
4.3 Alt Proje Tanımı ve Faaliyetler	12
5. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı	14
6. Roller ve Sorumluluklar	32
7. Kapasite Geliştirme ve Eğitim.....	34
8. Uygulama Takvimi ve Maliyet Tahminleri.....	35
9. Paydaş Katılımı ve Şikayet Mekanizması	36
10. Yüklenicinin Referans Belgeleri	40
11. İnceleme ve Onay	40
EKLER.....	41

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ekler Listesi

Ek 1. Proje Alanı Fotoğrafları	42
Ek 2. Proje Alanı ve Çevresinin Havadan Görünümü	49
Ek 3. Arazi Kayıt Belgeleri	50
Ek 4. Topoğrafik Araştırma	51
Ek 5. İmar Durumu Yazısı	53
Ek 6. Paydaş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı için Resmi Bildiri Yazısı	54
Ek 7. Paydaş Katılım Toplantısının Kamuoyuna Duyurusu	55
Ek 8. Paydaş Katılım ve Bilgilendirme Toplantısı Kayıtları	56
Ek 9. Projeye Özel ÇSYP Sunum Materyalleri	59
Ek 10. Proje Tasarım Sunumu	65
Ek 11. Paydaş Katılım ve İstişare Toplantısından Fotoğraflar	67

Tablo Listesi

Tablo 1 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı	15
Tablo 2 Roller ve Sorumluluklar	32
Tablo 3 Gösterge ÇSYP Uygulama Bütçesi	35

Şekil Listesi

Şekil 1: Beykoz Anadolu Lisesi'nin Genel Görünümü (Beykoz, İstanbul)	12
--	----

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Kısaltmalar

AoI	Etki Alanı
AAT	Atık Su Arıtma Tesisi
ADMP	Acil Durum Müdahale Planı
CERC	Acil Durum Müdahale Bileşeni
CİMER	Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
Ç&S	Çevresel ve Sosyal
ÇED	Çevresel Etki Değerlendirmesi
ÇSÇ	Çevresel ve Sosyal Çerçeve
ÇSS'ler	Çevresel ve Sosyal Standartlar
ÇSSG	Çevre, Sosyal ve Sağlık ile Güvenlik
ÇSYÇ	Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi
ÇSYP	Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
DB	Dünya Bankası
DK	Davranış Kuralları
GBV	Cinsiyete Dayalı Şiddet
IRP	İstanbul Dirençlilik Projesi
İBB	İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İPKB	İstanbul Proje Koordinasyon Birimi
İSG	İş Sağlığı ve Güvenliği
İY Planı	İşgücü Yönetim Planı
İYP	İşgücü Yönetim Prosedürleri
KKE	Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
MEB	Milli Eğitim Bakanlığı
MSDS	Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
PKP	Paydaş Katılım Planı
SEA/SH	Cinsel İstismar ve İstismar/Cinsel Taciz
ŞM	Şikayet Mekanizması
TSG	Toplum Sağlığı ve Güvenliği
WHO	Dünya Sağlık Örgütü
Y-ÇSYP	Yüklenici Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

YİMER Yabancılar İletişim Merkezi

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

1. Özet

Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından uygulanan İstanbul Dirençlilik Projesi (IRP), İstanbul İlinde acil durum hazırlıklarını güçlendirerek, afet risklerini azaltarak ve afetler sırasında ve sonrasında kritik kamu tesislerinin tam işlevsel kalmasını sağlayarak afet ve iklim dirençliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Proje dört bileşen altında yapılandırılmıştır:

1. Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Sisteminin Güçlendirilmesi
2. Kritik kamu binalarının ve tesislerinin dayanıklılığını artırmak
3. Proje Yönetimi ve Teknik Yardım
4. Acil Müdahale Bileşeni (CERC).

Bileşen 2 kapsamında, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki **Beykoz Anadolu Lisesi'nin yeniden inşası** IRP kapsamında finanse edilecek alt projelerden biri olarak seçilmiştir. Proje alanında, daha önce yapısal olarak savunmasız olarak değerlendirilen okul binası yıkılmış olup, en yüksek sismik ve iklim dirençlilik standartlarına uygun şekilde yeniden inşa edilecektir. Yeni bina, sadece bir eğitim kurumu olarak değil, aynı zamanda afet sonrası kendi kendine yeten bir barınak olarak da hizmet verecek ve acil durumlar sonrası kritik hizmetlerin sürekliliğini sağlayacaktır.

Alt projenin temel özellikleri şunlardır:

- **Neredeyse Net-Sıfır Enerji Kalitesinde Bina:** Enerji verimli sistemlerle (Türk TS825 ve IRP'nin Sınıf B performans standartlarıyla uyumlu), yenilenebilir enerji kurulumları (örneğin fotovoltaiik paneller) ve geliştirilmiş jeneratör kapasitesiyle tasarlanmıştır.
- **Su Güvenliği ve Depolama:** Afetler sırasında kesintisiz su teminini sağlamak için ek depolama tankları ve yağmur suyu toplama sistemleriyle donatılmıştır.
- **Acil Durum Hazırlığı:** Afet sonrası en az ilk 72 saat boyunca iletişim sistemleri ile temel ihtiyaç malzemelerinin (elektrik, su ve yiyecek) hem öğrenciler hem de çevre toplulukları destekleyecek şekilde entegrasyonu.
- **Kapsayıcı Tasarım/Evrensel Erişim:** Tesis, özellikle engelli bireyler ve diğer savunmasız gruplar için dokunsal yüzeyler, rampalar, asansörler ve erişilebilir hijyen tesisleri içerecek şekilde ulaşılabilir olacaktır.
- **Toplum Barınma Alanı Fonksiyonu:** Okul, acil durumlarda yerinden edilmiş bireyleri ağırlama potansiyeline sahip olacak şekilde tasarlanmıştır ve bu da İstanbul'un afet sonrası barınma kapasitesine katkıda bulunmaktadır.

Çevresel ve sosyal tarama, projenin IRP Harici Listesi'nin uygun olmayan faaliyetleri kapsamında olmadığını ve Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) kapsamında Orta Risk olarak sınıflandırıldığını doğrulamıştır. Başlıca beklenen riskler şunlardır:

- **İnşaatla ilgili riskler:** toz, gürültü, trafik aksaklıkları ve inşaat atıkları oluşumu.
- **İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) riskleri:** ağır ekipman, yükseklikte çalışma, malzeme kullanımı ve inşaat faaliyetleri sırasında potansiyel elektrik kazaları riskleri.
- **Toplum Sağlığı ve Güvenliği riskleri:** toz/gürültüye maruz kalma ve yerel trafikte küçük artışlar.
- **Atık Yönetimi:** inşaat atığı ve diğer katı ve sıvı atıklar, ulusal düzenlemeler ve IRP Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) doğrultusunda geri dönüşüm ve güvenli bertarafı sağlamak için dikkatli izleme, ayrıştırma ve yönetim gerektirecektir.

Azaltma önlemleri, IRP'nin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ), İşgücü Yönetim Prosedürleri (İYP) ve Paydaş Katılım Planı (PKP) ile uyumlu olarak geliştirilecek ve uygulanacaktır. Ulusal mevzuatlar ile Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Standartlarına (ÇSS) uyumu sağlamak için alana özgü bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) uygulanacaktır.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Tüm proje paydaşları, çalışanlar ve toplum üyeleri dahil olmak üzere, alt projeyle ilgili endişeleri, şikayetleri veya önerileri dile getirmek üzere özel bir Şikayet Mekanizması sunulacaktır. Genel Yönetici erişilebilir, şeffaf ve kapsayıcı olacak, zamanında yanıtlar ve etkili çözüm sağlayacak. Cinsel İstismar ve İstismar/Cinsel Taciz (SEA/SH) ile ilgili hassas vakalar için özel kanallar sağlanacak, gizlilik ve mağdur odaklı prosedürler garanti edilecek.

Beykoz Anadolu Lisesi'nin yeniden inşası ise, eğitim sürekliliğini artıran, savunmasız grupları koruyan ve Beykoz ile ötesinde acil müdahale kapasitesini destekleyen güvenli, dayanıklı, yeşil ve kapsayıcı bir kamu tesisi sağlayarak IRP'nin hedeflerine doğrudan katkıda bulunacaktır.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

2. Giriş

Bu ÇSYP, IRP kapsamında, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve İPKB tarafından uygulanan Beykoz Anadolu Lisesi'nin yeniden inşası için hazırlanmıştır.

Bu ÇSYP'nin amacı, alt projenin potansiyel çevresel ve sosyal risklerini ve etkilerini belirlemek ve uygun azaltma ve izleme önlemleri önermektir. ÇSYP, proje faaliyetlerinin Dünya Bankası ÇSÇ'ye, özellikle ilgili ÇSS'lere ve Çevre Yasası 2872 (1983) dahil olmak üzere geçerli Türk yasa ve yönetmeliklerine uygun şekilde uygulanmasını sağlar.

Bu ÇSYP'de tanımlanan azaltma önlemleri ihale belgelerine dahil edilecek ve bunların uygulanması, İPKB ve Müşavir gözetimi altında yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu ÇSYP canlı bir belgedir ve uygulama sırasında saha koşullarını, izleme sonuçlarını ve paydaş geri bildirimlerini yansıtacak şekilde gerektiğinde güncellenecektir.

3. Hukuki ve Kurumsal Çerçeve

Bu ÇSYP, Dünya Bankası Çevre ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) ve ilgili Çevresel ve Sosyal Standartlar (ÇSS) ile çevre, işgüğü, iş sağlığı ve güvenliği ile inşaatı düzenleyen kurumun ulusal yasa ve yönetmelikleriyle uyumlu olarak geliştirilmiştir.

Temel geçerli mevzuatlar arasında Çevre Yasası No. 2872, İş Yasası No. 4857, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası No. 6331 ve ilgili ikincil düzenlemeler yer almaktadır. Ulusal mevzuat ile Dünya Ticaret Merkezi (DB) ÇSÇ'si arasında tutarsızlıklar ortaya çıktığında, daha yüksek düzeyde çevresel ve sosyal koruma gerektirmesi uygulanacaktır.

Bu ÇSYP'nin uygulanması, İPKB'nin kurumsal düzenlemeleri aracılığıyla sağlanacak; Müşavir tarafından izleme ve denetim yapılacak, günlük uyum ise yüklenici tarafından sağlanacaktır.

IRP ÇSYÇ kamuoyuna açıklanır ve aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir:

[Türkçe Versiyonu](#)

[İngilizce Versiyon](#)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

4. Genel Proje ve Proje Alanı Bilgileri

Türkiye, sismik etkisi, kentleşme ve artan nüfusu nedeniyle önemli afet riskleriyle karşı karşıyadır. IRP, kritik kamu binalarını güçlendirerek ve afetler sırasında ve sonrasında faaliyette kalmasını sağlayarak bu riskleri ele almak üzere tasarlanmıştır. Bu çerçevede, Beykoz Anadolu Lisesi'nin yeniden inşası *Bileşen 2: Kritik Binaların ve Tesislerin Dayanıklılığının Artırılması kapsamında finanse edilecek alt projelerden biri olarak seçilmiştir.*

Alt projenin temel amacı, okulu en yüksek sismik ve iklim dirençlilik standartlarına göre yeniden inşa etmek ve felaketin ilk 72 saatinde temel hizmetleri (elektrik, su, yiyecek ve iletişim) sağlayabilen kendi kendine yeten bir barınma olarak donatmaktır. Bu nedenle proje, hazırlık sürecinin güçlendirilmesine, acil müdahale kapasitesinin desteklenmesine ve eğitimin sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

İnşaat faaliyetleri, eski yapısal olarak zayıf olan binanın zaten yıkıldığı ve temizlendiği alanda yeni inşaat çalışmalarından (kazı, demirbeton, bitirme işleri ve peyzaj düzenlemeleri) oluşacak. Bu faaliyetlerin ses, toz, trafik ve atık gibi geçici, yerel ve yönetilebilir çevresel ve sosyal etkiler yaratması beklenmektedir.

Ulusal mevzuata göre, bu tür okul yeniden inşa projeleri mevcut Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında ÇED'e tabi değildir, ancak yine de ilgili tüm çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile inşaat yönetimi gerekliliklerine uyulacaktır.

Bu nedenle ÇSYP, potansiyel riskleri belirlemek, hafifletme önlemleri önermek ve inşaat ile işletme faaliyetlerinin hem ulusal düzenlemeler hem de Dünya Bankası ÇSÇ'ye uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için bir rehber belge olarak hazırlanmıştır.

4.1 Proje Tanımı

Alt Proje Başlığı:	Okulların Yeniden İnşası (Neredeyse net sıfır kaliteli, afet sonrası kendi kendine yeten bina)
Konum:	Çavuşbaşı Mahallesi, Çengeldere Caddesi, Yeşilvadi Sokak No:10/1 Beykoz / İstanbul Parsel 1440 /46
Uygulayıcı Kurum:	İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)
Sorumlu Kullanıcı Kurumu:	Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Saha Durumu:	Proje alanı şu anda boş durumdadır. Eski bina zaten yıkılmış ve enkaz temizlenmiştir.
Bina Bilgileri:	Proje, arazi kayıtlarında belirtildiği üzere 20.777,49 m ² alan içinde yer almakta olup, toplam kapalı inşaat alanı 9.789,64 m ² olarak planlanmaktadır.
Tahmini Maliyet:	Proje, 9.789,64 m ² kapalı alandan oluşmakta olup, ilgili otoriteler kendi maliyet tahminlerini geliştirmelidir.
İnşaat Dönemi:	18 ay (Yaklaşık)

4.2 Genel Bilgiler ve Amaçlar

Beykoz, Türkiye'nin Marmara Bölgesi içinde İstanbul'un Asya tarafında yer alan bir ilçedir. Bölge, Boğaz'ın kuzey kesimi boyunca uzanır ve yerleşim yerleri, geniş orman alanları ve kamusal açık alanların birleşimiyle karakterize edilir. İstanbul'un merkez ilçelerine kıyasla Beykoz'un kentsel yoğunluğu nispeten daha düşük, ormanlar ve su toplama bölgeleri dahil olmak üzere doğal ve yarı doğal alanlar daha büyük bir orana sahiptir. İlçe, İstanbul'un diğer bölgelerine erişim sağlayan yerleşik bir yol ağı, toplu otobüs hizmetleri ve feribot bağlantılarıyla hizmet vermektedir. Arazi kullanımı ağırlıklı olarak konut, kurumsal ve rekreasyon amaçlıdır; ticari ve endüstriyel faaliyetler sınırlıdır. Beykoz ayrıca

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

yerel nüfusu destekleyen çeşitli eğitim, sağlık ve kamu hizmeti tesislerine sahiptir. Alt proje alanı, Beykoz'un Çavuşbaşı Bölgesi'nde, Yeşilvadi Caddesi, Parsel 1440/46'da yer almaktadır. Bölge, imar planı kapsamında Lise Alanı olarak belirlenmiş olup, arazi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devlet mülkiyetindedir ve resmi olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) tahsis edilmiştir.

Eski yapısal olarak zayıf bina yıkıldığı için alan şu anda boştur. Beykoz Anadolu Lisesi için eğitim faaliyetleri, inşaat sırasında aksaklık önlemek amacıyla geçici olarak başka bir binada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda ve ilgili resmî prosedürlere uygun şekilde sürdürülmektedir.

Bina Konumu

Alt proje bölgesi yerel yollarla kolayca erişilebilir olup, Beykoz'a toplu ve özel ulaşım seçenekleriyle bağlıdır.

Etki Alanı (Area of Influence-AoI), proje alanının bulunduğu daha geniş yapılaşmış alanı kapsayacak şekilde mahalle ölçeğinde tanımlanmıştır. AoI; çevredeki konut alanlarını ve yakın kamu tesislerini içermektedir. AoI içinde belirlenen alıcılar dikkate alındığında, başlıca hassas alıcılar aşağıda sunulmuştur (yaklaşık kuş uçuşu mesafeler):

- **Konut ve ticari binalar:** Çevredeki arazi kullanımı ağırlıklı olarak konut alanıdır; alçak katlı apartmanlar ve müstakil evlerden oluşmaktadır. Yakındaki yerel yollar boyunca sınırlı sayıda mahalle ölçeğinde ticari işletmeler bulunmakta, proje alanının hemen yakınında büyük ticari veya endüstriyel alanlar bulunmamaktadır.
- **Eğitim tesisleri:** AoI bünyesinde bulunan eğitim tesisleri arasında, proje alanının merkezine yaklaşık 576 m mesafede Özel Beykoz Final Okulları bulunmaktadır.
- **Sağlık tesisleri:** Proje alanının hemen yakınında herhangi bir sağlık tesisi tespit edilmemiştir.
- **Dini tesisler:** AoI içinde çeşitli dini tesisler bulunmaktadır. Bunlar arasında proje alanının merkezinden Çavuşbaşı Yeşil Camii (~202 m) ve Ahmetler Camii (~365 m) bulunmaktadır.
- **Devlet/kamu tesisleri:** Proje alanının hemen yakınında herhangi bir devlet veya kamu hizmeti tesisi tespit edilmemiştir.
- **Altyapı:** Proje alanına yakın bir yerde büyük altyapı tesisi (su rezervuarları, arıtma tesisleri veya enerji tesisleri gibi) tespit edilmemiştir. Ayrıca, çevredeki uydu görüntülerinde görülebilen Çengel Deresi (Çengel Dere) Projenin Etki Alanı dışında yer almaktadır. Bu nedenle, dereye proje kaynaklı herhangi bir etki beklenmemekte ve izin sürecinde ilgili otoriteden özel izinler, onaylar veya ek görüşler gerekmemektedir.
- **Ulaşım altyapısı:** Proje alanına yakın bir metro veya demiryolu hattı bulunmamaktadır.

Toplum Sağlığı ve Güvenliği (TSG) riskleri, Trafik Yönetim Planı gibi ilgili alt planlar dahil olmak üzere ÇSYP ve Yüklenici ÇSYP (Y-ÇSYP) aracılığıyla yönetilecektir. AoI'deki hassas reseptörlere, özellikle yakındaki eğitim tesislerine özel önem verilecek ve inşaat sırasında bozulmaların en aza indirilmesi için iletişim sağlanacaktır.


Proje alanının genel bir görünümü Şekil 1'de sunulmaktadır: Şekil 1. Proje alanının çevresi ağırlıklı olarak konut binalarından (kuzey, güney ve batıda) oluşmakta olup, parselin kuzey tarafında bir transformatör bulunmaktadır.

Saha fotoğrafları (Ek 1) — giriş, bahçe ve çevresindeki ağaçların görüntüleri ile uydu ve hava görüntüleri (Ek 2) ve arazi kayıtları (Ek 3) bu ÇSYP'nin eklerinde yer almaktadır. Ayrıca, proje alanını ve yakınındaki yapıları gösteren bir konum haritası Ek 2'de sunulmaktadır.

Ek 3 (Arazi Kayıt Belgeleri), proje alanının resmi tapu bilgilerini, parsel ve blok numaraları, toplam arazi alanını (9.789,64 m²), arazi kullanım tanımını ("Lise Alanı") ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na kayıt dahil olmak üzere sunmakta olup, kamu mülkiyetini ve eğitim amaçlı Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisi doğrular. Ek 4 (Topografik Araştırma), sahanın mevcut cephesi, sınırları ve fiziksel özellikleri

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

hakkında ayrıntılı bilgiler sunarak yeni okul binasının tasarımı ve düzenini destekler. Ek 5 (İmar Durumu Yazısı) arazi kullanım tanımının resmi onayını içerir ve alanın ilgili imar planları kapsamında bir Lise Alanı olarak planlandığını doğrular.

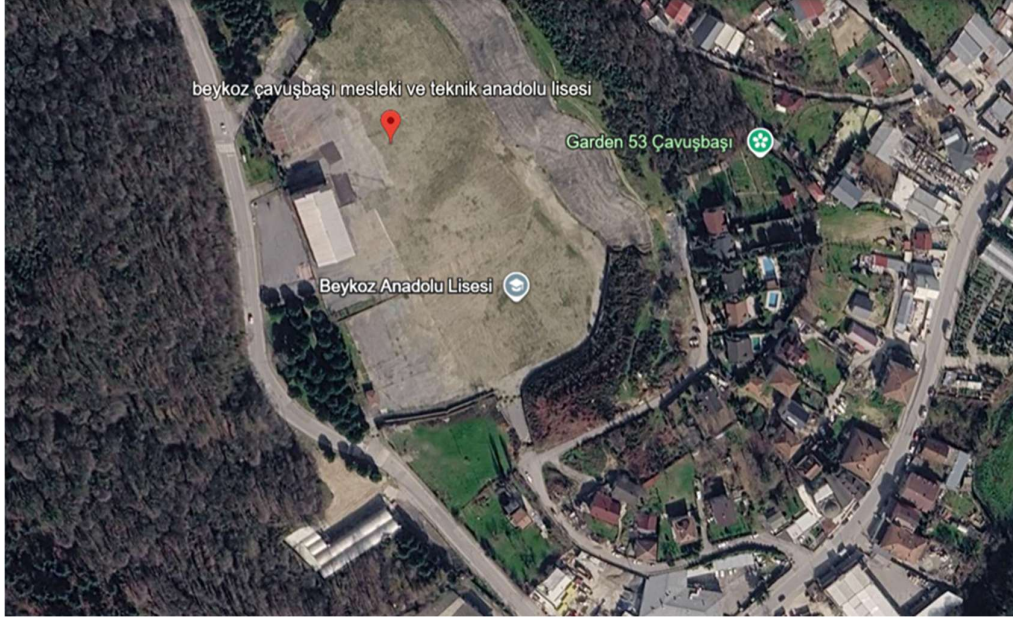

Şekil 1: Beykoz Anadolu Lisesi'nin Genel Görünümü (Beykoz, İstanbul)

4.3 Alt Proje Tanımı ve Faaliyetler

Alt proje, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Beykoz Anadolu Lisesi'nin yeniden inşasını içermektedir. Yapısal olarak zayıf olarak tanımlanan eski okul binası halihazırda yıkılmıştır. Alan şu anda boş ve inşaat çalışmalarına hazırdır.

Yeni okul, yaklaşık 9.789,64 m² kapalı alana sahip tek bloklu bir bina olarak inşa edilecektir. En yüksek sismik ve iklim dayanıklılık standartlarını karşılayacak şekilde ve afet sonrası kendi kendine yeten bir barınma alanı olarak işlev görecektir. Temel tasarım özellikleri şunlardır:

- Ek su depolama kapasitesi,
- Yenilenebilir enerji sistemleri (örneğin fotovoltaik paneller),
- Genişletilmiş jeneratör kapasitesi, ve
- Acil durumlarda bina işlevselliğini sağlamak için geliştirilmiş iletişim sistemleri.

Planlanan inşaat faaliyetleri şunlardır:

- Saha hazırlığı ve kazı,
- Demirbeton ve üst yapı çalışmaları,
- İç ve dış kaplama işleri,
- Peyzaj ve dış düzenlemeler, ve
- Yapı malzemeleri ve ekipmanlarının tedarik edilmesi ve kurulumu.

Ulaşım güzergahları, elektrik, su veya atık su hatları gibi yeni altyapıya ihtiyaç yoktur; çünkü alan zaten mevcut kentsel altyapı tarafından hizmet edilmektedir.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

İnşaat faaliyetlerinin, toz ve gürültü emisyonu, inşaat atıklarının oluşumu, artan trafik ve toplum sağlığı ve güvenliği (TSG) ile iş sağlığı ve güvenliği (İSG) için potansiyel riskler gibi tipik kısa vadeli çevresel ve sosyal etkiler yaratması beklenmektedir. Bu etkiler, bu ÇSYP' ve Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'nda (Y-ÇSYP) tanımlanan önlemlerin uygulanmasıyla azaltılacak ve ilgili ulusal düzenlemelere ve IRP ÇSYÇ'ye uyum sağlanacaktır.

5. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Bu ÇSYP, Yüklenici ve diğer sorumlu tarafların alt proje faaliyetleri sırasında potansiyel çevresel ve sosyal riskleri ve etkileri önlemek, en aza indirmek veya azaltmak için uygulamaları gereken temel önlemleri belirtir. Beykoz Anadolu Lisesi'nin yeniden inşası için belirlenen sahaya özgü riskleri, ilgili azaltma önlemlerini, göstergeleri ve sıklığı izlemeyi, atanan sorumlulukları, gösterge maliyetlerini ve proje uygulamasında yer alan tüm tarafların genel rollerini özetlemektedir.

ÇSYP, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı ve güvenliği, atık yönetimi ve paydaş katılımı dahil olmak üzere tüm proje ile ilgili risklerin Dünya Bankası ÇSÇ ve ilgili ulusal mevzuatla uyumlu şekilde yönetilmesini sağlamak için pratik bir araç olarak hizmet vermektedir.

Müşavir (Kontrol), azaltma önlemlerinin uygulanmasını izlemekten, Yüklenicinin çevresel ve sosyal yönetim sistemi ile performansını, organizasyon kapasitesini ve alana özgü alt planlarını değerlendirmekten sorumlu olacaktır. Danışman ayrıca Yüklenicinin ÇSYP'sini (Y-ÇSYP) inceleyecek ve iyileştirme önerileri sunacaktır. **Yüklenici, inşaat çalışmalarına başlamadan önce**, bu alt projenin ÇSYP'sine dayalı Yüklenicinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'nı (Y-ÇSYP) hazırlamak, benimsemek ve **uygulamak yükümlüdür**; böylece tüm çevresel ve sosyal taahhütler tam olarak yerine getirilir.

Y-ÇSYP'ye ek olarak, **Yüklenici aşağıdaki alt yönetim planlarını** Müşavir tarafından incelenmek ve İPKB tarafından onaylamak **üzere hazırlayıp sunacaktır**:

- Atık Yönetim Planı
- Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı
- Trafik Yönetim Planı
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Planı
- Yüklenicinin İş Gücü Yönetim Planı (Proje İYP'si ile uyumlu olarak)
- Proje Düzeyinde Paydaş Katılım Planı (Project PKP ile uyumlu olarak)
- Şikayet Mekanizması (GM) (İşçiler ve topluluklar için prosedürler)
- Şans Eseri Buluntu Prosedürleri

Tüm alt yönetim planları inşaat çalışmaları başlamadan önce sunulacak ve onaylanacak ve inşaat süresi boyunca yürürlükte kalacaktır.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Tablo 1 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
Tüm İnşaat İşleri için Genel									
Çevresel ve Sosyal (Ç&S) Yönetimi	Yüklenici, onay için hazırlayıp sunacak ve ardından Yüklenici ÇSYP (Y-ÇSYP) uygulamasını uygulayacaktır. Y-ÇSYP, inşaat çalışmalarının başlamasından önce sunulmalıdır ve İPKB tarafından Müşavirin desteğiyle incelenip onaylanana kadar alt proje kapsamında herhangi bir inşaat faaliyeti yürütülmemelidir. Y-ÇSYP, en az aşağıdaki projeye özel yönetim planlarını içerecektir: • İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim planı, risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı dahil (projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi'nin (ÇSYÇ) EK 6 ve EK 9'daki taslağa bakınız) • Toplum sağlığı ve güvenliği (TSG) yönetim planı, trafik yönetim planı dahil (projenin ÇSYÇ EK 7'ye bakınız) • Atık Yönetim Planı (projenin ÇSYÇ EK 5'ine bakınız) • Şans Eseri Buluntu Prosedürleri (bkz. Proje ÇSYÇ EK 4) • Yüklenicinin İşgücü Yönetim Planı (Proje İYP'ye göre hazırlanacaktır.) • Proje Düzeyinde Paydaş Katılım Planı (Proje PKP uygun olarak hazırlanacaktır) • Hem topluluk hem de çalışanlar için şikayet mekanizması (ŞM).	X	X		Tüm alt yönetim planları inşaatın önce onaylanır ve inşaat süresi boyunca uygulanır		X		Yüklenici (Uygulama) İPKB/Müşavir (Kontrol)
	Yüklenici, inşaat çalışmalarına başlamadan önce tam zamanlı bir çevre ve sosyal hem-de bir İSG uzmanı işe alacak veya atayacaktır. Yüklenici, uzmanların CV'lerini onay için İPKB'ye Müşavir aracılığıyla sunacaktır. Bu uzmanlar, inşaat süresi boyunca sahada bulunmalıdır.	X	X		İlgili Ç&S personeli, inşaat süresince harekete geçirilir ve bakımı		X		Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
					yapılır				
	Yüklenici, önerilen inşaat çalışmalarıyla ilgili temel çevresel, sosyal, sağlık ve güvenlik (ÇSSG) riskleri ve işçilerin sorumluluğu hakkında tüm personeline sahada çalışmaya başlamadan önce bir eğitim programı hazırlayacak ve eğitim verecektir. Eğitim programı üç ayda bir tekrarlanacaktır. Yüklenicinin üç aylık eğitim programı, özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel taciz, cinsel ve/veya cinsiyete dayalı şiddet dahil şiddet ve yerel toplumla etkileşimde saygılı tutumlar gibi Davranış Kuralları (DK) ile ilgili konuları da kapsayacaktır.	X	X		Eğitim programı onaylanmış ve ilgili tüm personel eğitilmiş Eğitim kayıtları		X		Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)
Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlemesi	Belirlenen riskleri ele almak ve kaynak verimliliğini artırmak ile kirlilik önleme yöntemlerini artırmak için aşağıdaki önlemler uygulanacaktır: - Tüm yenilenmiş binaların en az Türk Sınıf C Enerji Performans Sertifikasyon standartlarına (TS825) ulaşmasını ve yeni inşa edilen tüm binaların en az Sınıf B seviyesine ulaşmasını sağlamak. - Güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji sistemlerini entegre ederek enerji tüketimini azaltmak ve afetler sırasında operasyonel sürekliliği sağlamak. - Düşük akışlı tuvaletler, verimli musluklar ve duş başlıkları dahil su tasarrufu sistemleri kurmak, mümkün ve/veya uygulanabilir yerlerde yağmur suyu toplama ve gri suyun yeniden kullanımını uygulamak. - Yıkım malzemelerini (örneğin, dolgu malzemesi olarak döküntü) yeniden kullanmak ve demir ile diğer geri dönüştürülebilir malzemelerin yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak. - Yağmur suyunu yönetmek, kentsel ısı etkilerini azaltmak ve mümkün ve/veya uygulanabilir yerlerde biyolojik çeşitliliği korumak için parklar, yeşil çatılar ve bitki tamponları oluşturarak	X	X		Enerji ve su verimliliği standartların a uyum, doğru atık ve kirlilik yönetimi, doğa temelli çözümlerin uygulanması ve paydaşların geri bildirim çözümlenmesi			X	Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	yeşil altyapıyı geliştirmek. - Doğa temelli çözümlerin performansını düzenli olarak izleyip değerlendirerek uzun vadeli etkinliklerini güvence altına almak. - İşletme sürecinde atık yönetiminin yapılacağı alanlar planlama aşamasında belirlemek. - Planlama aşamasında, sahadaki mevcut ağaçları belirlemek ve belgelemek için bir ağaç araştırması yapmak; böylece mümkün olan her yerde olgun ağaçların korunması ve korunmasını sağlamak. - Ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemelerinde, yangına dayanıklı yerli bitki türlerinin kullanılması; kentsel ısı adası etkisinin azaltılmasına katkı sağlarken ekolojik işlevleri desteklemek. - Yağmur suyu bahçeleri, geçirgen yüzeyler ve benzeri doğa temelli çözümler ile yüzeyel akışı azaltmak, yeraltı suyu beslenmesini artırmak ve yerel ekosistemleri geliştirmek.								
Hava Kirliliği (Toz ve Egzoz)	- Kuru mevsimde, açık çalışma alanlarından kaynaklanan tozu en aza indirmek amacıyla zemine düzenli olarak su uygulamak. - İnşaat enkazlarını kontrollü bir alanda tutmak ve özellikle kuru mevsimde toz oluşumunu azaltmak amacıyla su sisi şeklinde püskürtme yapmak - Rüzgârlı günlerde ve sokak hayvanlarının rahatsız edilmesini önlemek amacıyla agrega malzemesi stoklarını kapatarak ince toprak parçacıklarının askıya alınmasını ve yayılmasını önlemek; kazı sırasında pnömatik sondaj yapılması durumunda, tozu sürekli su püskürtme ve/veya inşaat toz perdeleri kullanarak bastırmak. - Proje alanı çevresini, özellikle yolları, toz oluşumunu en aza indirecek şekilde enkazdan arındırılmış olarak muhafaza etmek. - Kazı malzemesi veya inşaat atığı taşıyan kamyonların yüklerini, taşıma sırasında toz oluşumunu ve malzeme dökülmesini önlemek amacıyla güvenli biçimde kapatmak.	X			Hava kalitesi kontrol önlemlerinin görsel denetimi Bakım kayıtları Şikayet kayıtları	X			Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	• Şantiye sahasında inşaat ve/veya atık malzemelerin açık alanda yakılmasını yasaklamak.								
Gürültü	• İnşaat faaliyetlerini, ulusal mevzuatta belirlenen çalışma saatleri ile sınırlamak ve gürültü oluşturan faaliyetleri en az rahatsızlık yaratacak zaman dilimlerinde planlamak amacıyla yakın çevredeki topluluklarla, özellikle okullar, koordinasyon sağlamak. • Operasyonlar sırasında, ekipmanları konut ve/veya topluluk alanlarından mümkün olan en uzak noktalara yerleştirmek. • Tüm ekipmanların, bakım prosedürleri oluşturularak iyi çalışır durumda tutulmasını sağlamak ve özellikle jeneratörler için akustik muhafazalar kurmak. • Gerektiğinde, çitler, bariyerler veya saptırıcılar (örneğin, yanmalı motorlar için susturucular veya hızlı büyüyen ağaç türlerinin dikilmesi) gibi uygun gürültü kontrol yöntemlerini kullanmak. • Gereksiz alarm, korna ve siren kullanımından kaçınmak. • Topluluk alanlarından geçen proje taşımacılığını en aza indirmek. • Proje alanı ile yerleşim alanları arasında, açık alanlar, ağaç sıraları veya bitki örtüsü alanları gibi tampon bölgeler oluşturarak gürültünün yaşam alanlarına etkisini azaltmak. • En yakın alıcılar tarafından gürültüye ilişkin herhangi bir şikâyet alınması durumunda gürültü ölçümleri yapmak; ölçülen seviyelerin sınır değerlerin üzerinde olması hâlinde, akustik bariyerlerin kurulması veya belirli ekipman ya da faaliyetlerin çalışma saatlerinin sınırlandırılması gibi ilave azaltıcı önlemleri uygulamak.	X			Gürültü kontrol önlemlerinin görsel denetimi Şikâyet kayıtları	X			Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)
Sağlık ve Güvenlik Yüksekte çalışma, döner ve hareket	Çalışmalar planlanırken, insan sağlığı ve güvenliğinin korunmasını sağlamak amacıyla alınacak önlemlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki hususların dikkate alınması faydalı olacaktır:	X			Görsel inceleme Çalışan	X			Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
eden ekipmanlar, elektrik güvenliği, tehlikeli maddelerle çalışma gibi iş yerlerinde güvensiz uygulamalar ve tehlikeler nedeniyle İSG ile ilgili riskler.	- İnşaat alanı: Ortadan kaldırılabilir veya insanların uyarılması gereken herhangi bir tehlike var mı? - İnşaat faaliyetlerine katılacak kişiler: Görev alacak personelin, işleri güvenli bir şekilde yerine getirebilecek yeterli mesleki yetkinliğe, deneyime ve fiziksel uygunluğa sahip mi? - Ekipman: Kullanılacak ekipmanların güvenli ve çalışır durumda olduğunu teyit etmek amacıyla gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak; ekipmanların güvenli kullanımı için özel eğitim, yetkinlik veya bilgiye ihtiyaç var mı? - Elektrik Güvenliği: Sahada güvenli uzatma kabloları, voltaj regülatörleri ve devre kesiciler kullanılıyor mu, güvenlik önlemleri kapsamında elektrik kabloları uygun şekilde etiketlenmiş mi, kablolardan yanık kokusu gibi aşırı ısınma belirtileri tespit ediliyor mu? Çalışma alanı voltaj dedektörleri, kelepçe ölçerler ve priz test cihazlarıyla donatılmış mı?				kayıtları Ekipman				
	- İnşaat sahalarında uygun işaretlemeler yapılarak, işçilerin uyması gereken temel kurallar ve düzenlemeler hakkında bilgilendirme sağlanacaktır. - Yüklenicinin İSG uzmanı, inşaat işçilerine her gün ve o gün gerçekleştirilecek inşaat faaliyetleriyle ilgili ÇSSG riskleri hakkında kısa günlük bir toolbox eğitimleri verecektir. - Yüklenici, işçiler için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak ve inşaat faaliyetlerine başlamadan önce uluslararası en iyi uygulamalar ve Türk Mevzuatı ile uyumlu (baret, eldiven, toz maske, gözlük, koşum ve emniyet botları vb.) kişisel koruyucu ekipmanları (KKE) sağlayacaktır. - Tüm faaliyetler, hem İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete No:28339) ve ilgili yönetmelikleri ile	X			Kontrol önlemlerinin görsel denetimi İSG kayıtları Çalışan kayıtları Olay istatistikleri ve kayıtları,	X			Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	Dünya Bankası Grubu ÇSS Çerçevesi kapsamında uygulanacaktır. - Yüklenici, çevre, etkilenen topluluklar, halk veya işçiler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabilecek herhangi bir ciddi olay hakkında (denetim danışmanları aracılığıyla) İPKB'yi derhal bilgilendirecektir. Daha sonra İPKB, herhangi bir ciddi olayı 48 saat içinde Dünya Bankası'na bildirecek ve en geç 10 gün içinde temel neden analizi ve düzeltici eylem planıyla birlikte bir olay soruşturma raporunu Dünya Bankası'na gönderecektir. - Çalışma alanı, günlük olarak temiz tutulacak ve enkazdan arındırılacaktır. - İlk yardım çantası, bandaj, antibiyotik krem ve benzeri temel malzemelerle donatılacak veya gerektiğinde sağlık kuruluşlarına teslim edilecektir. - Tehlikeli maddelerin depolanması, taşınması ve dağıtımı sırasında ilgili güvenlik yönergelerine uyularak yanlış kullanım, dökülme ve kazara insan maruziyeti potansiyeli en aza indirilecektir. - Aşındırıcı sıvılar ve diğer zehirli maddeler, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) kapsamında uygun şekilde kapalı kaplarda saklanacak ve güvenli alanlarda uygun şekilde bertaraf edilecektir. - Yapısal açıklıkların, yeterli şekilde kapatıldığı ve korunduğu sağlanacaktır. - Çatılarda veya açık zeminlerde saklanan gevşek veya hafif malzemeler sabitlenecektir. - Hortumlar, enerji kabloları, kaynak kabloları ve benzeri ekipmanlar, yoğun kullanılan yürüme yolları veya alanlarda bulundurulmayacaktır. - Yoğun yağışlar veya herhangi bir acil durum meydana geldiğinde tüm çalışmalar askıya alınacaktır.				neredeysse kayıplar dahil İşçi şikayetlerini n kayıtları				

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	- Yüksekte yapılan inşaat faaliyetleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemleri uygulanacak ve mümkün olduğunca çalışmalar zemin seviyesinden gerçekleştirilecektir. - Aşağıdaki kişisel risklere sahip kişilerin yüksekte çalışma faaliyetlerine katılmasına izin verilmeyecektir: görme veya denge sorunları; osteoporoz, diyabet, artrit veya Parkinson hastalığı gibi belirli kronik rahatsızlıklar; uyku ilaçları, sakinleştiriciler, tansiyon ilaçları veya antidepresanlar gibi bazı ilaçların kullanımı; son 12 ay içinde düşme vakası yaşanmış olması vb - Yalnızca, yeterli beceri, bilgi ve deneyime sahip kişilerin söz konusu görevleri yerine getirmesine izin verilecektir. - Yüksekte yapılacak çalışmaların gerçekleştirileceği alanların (örneğin çatılar) güvenli olduğu teyit edilecektir. - Hassas yüzeylerde veya bu yüzeylerin yakınında yürütülecek çalışmalar için gerekli koruyucu önlemler alınacaktır. - Acil Durum Müdahale Planı doğrultusunda, kayma riskini önlemek amacıyla yağ, gres, boya ve kir gibi maddeler derhal temizlenecektir. - Düşmeye karşı koruyucu önlemler sağlanacak; bu kapsamda, emniyet kemerleri ile yerden 4 metreden daha yüksek seviyelerde yürütülen işler için uygun iskeleler ve/veya koruyucu korkuluklar kullanılacaktır. - Yüklenici, özel inşaat makinelerinin güvenli şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla eğitimli ve yetkin operatörler görevlendirecektir.								
Toplum Sağlığı ve Güvenliği Atık, durgun su, atık su, partikül maddeler ve inşaat işçilerine	- İnşaat alanı, ipler ve benzeri fiziksel engellerle çevrilecek; malzeme depoları ve depolama alanları halktan uzak tutulacak ve tehlikeli bölgelerde uygun uyarı işaretleri yerleştirilecektir. - Yetkisiz kişilerin inşaat alanlarına girişine izin verilmeyecektir. - Sivrisinekler ve diğer hastalık vektörlerinin üremesini önlemek amacıyla, inşaat alanlarında biriken durgun sular düzenli olarak		X		Kontrol önlemlerinin görsel denetimi Trafik	X			Müteahhit Müşavir (Denetim)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
maruz kalmaktan kaynaklanan sağlık sorunları ile inşaat faaliyetleriyle ilgili toplum sağlığı ve güvenliği riskleri; ayrıca artan trafik hacmi ve yetersiz inşaat ve trafik yönetimi nedeniyle ağır araç hareketinin neden olduğu trafik ve yol riskleri de yer alır.	boşaltılacaktır. - Atık sular, sızıntı ve koku oluşumunu önlemek amacıyla kapalı depolama sistemlerinde muhafaza edilecek; ayrıca, yakın çevredeki su kütlelerinin kirlenmesini önlemek için güvenli drenaj sistemleri korunacaktır. - Çalışanlar için, tuvaletler ve el/yıkama istasyonları dâhil olmak üzere temiz, yeterli ve bakımlı sanitasyon olanakları sağlanacaktır. - İnşaat sahasında görev yapan güvenlik personeli, gerekli eğitimleri almış ve resmî olarak sertifikalandırılmış olacaktır. - Araçların sürüş hızları, özellikle yerleşim alanlarından, okullardan, sağlık tesislerinden ve diğer hassas alanlardan geçişlerde kontrol edilecektir. - Eğer yakınlarda savunmasız yayalar veya tesis kullanıcıları bulunuyorsa, gerekli görüldüğü hâllerde okul saatlerinde trafik güvenliği personeli görevlendirilecektir. - Proje alanı, gece saatlerinde yeterli ve güvenli aydınlatma ile donatılacaktır. - İnşaat alanı ve çevresi, temiz tutulacak; atık birikimine izin verilmeyecek ve kırık camlar yangın riskini önlemek amacıyla derhal temizlenecektir. - Tehlikeli maddelerin sahaya taşınması sırasında, ilgili güvenlik yönergelerine uyulacak ve trafik kazaları sonucu dökülme ile kazara insan maruziyeti riskleri en aza indirilecektir. - Toplulukların, proje faaliyetleri, potansiyel riskler ve acil durum prosedürleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla etkili iletişim sistemleri kurulacaktır. - Araç ve ekipmanlar, arıza veya erken bozulmalardan kaynaklanabilecek ciddi kazaları önlemek amacıyla periyodik bakım ve kontrollerden geçirilecektir. - Kamuoyu, yürütülecek çalışmalar, iş akışı ve afet sonrası				kazası kayıtları Şikayet kayıtları				

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	bağlamda (örneğin bulaşıcı hastalık salgınları) alınan önlemler hakkında; iş yerleri dâhil olmak üzere tüm paydaşların erişebileceği alanlarda, uygun iletişim araçları ve yöntemleri (çevrim içi/sanal ve/veya fiziksel) kullanılarak bilgilendirilecektir. - Herhangi bir salgın, pandemi veya bulaşıcı hastalık durumunda, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan rehberler, yönergeler ve tavsiyeler uygulanacak; çalışanlar ve iş yerleri için İSG ve TSG kapsamında gerekli tüm önlemler alınacaktır. Ayrıca, tüm inşaat faaliyetleri Dünya Bankası yönergeleri ile uyumlu olarak yürütülecektir. - Acil Durum Müdahale Planı'na (ADMP), tahliye protokolleri, ilk yardım eğitimleri ve açık iletişim stratejileri dâhil edilerek toplum sağlığı ve güvenliği korunacaktır. - Herhangi bir trafik saptırması durumunda, engelli bireylerin ihtiyaçları dikkate alınacaktır. - Yüklenici, inşaat alanının uygun şekilde güvence altına alınmasını ve inşaat kaynaklı trafiğin (uygun güzergâh planlaması dâhil) düzenli şekilde yönetilmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda: - Tabelalar, uyarılar, bariyerler ve trafik yönlendirmeleri sağlanacak; alan görünür kılınacak ve halk olası tehlikelere karşı bilgilendirilecektir. - Trafik yönetim sistemi ve personel eğitimi, özellikle saha girişleri ve yakın çevredeki yoğun trafik koşulları dikkate alınarak uygulanacak; yayalar için güvenli geçiş alanları oluşturulacaktır. - Çalışma saatleri, yerel trafik düzenine uyulanacak; yoğun saatlerde veya hayvan hareketlerinin yoğun olduğu zamanlarda büyük taşıma faaliyetlerinden kaçınılacaktır. - Gerektiğinde, halk için güvenli ve düzenli geçiş sağlanması								

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	amacıyla sahada eğitimli ve görünür personel tarafından aktif trafik yönetimi uygulanacaktır.								
Su Kalitesi ve Atık Su: Yakınlardaki yüzey sularındaki su kirliliği, inşaat faaliyetleri nedeniyle inşaat alanında oluşan atık su/atık nedeniyle	- Saha, saman balyaları ve/veya silt çitler gibi uygun erozyon ve tortu kontrol önlemleri uygulayarak tortunun saha dışına taşınmasını ve yakındaki yüzey sularında aşırı bulanıklığa yol açmasını önleyecektir. - Sahada üretilen atık suyun depolanması veya bertaraf edilmesi en aza indirilecektir. - Yüzey sularına yakın veya yüzey suları içerisinde geçici ya da nihai atık bertarafı yapılması ve atık suların temizlenmeden boşaltılması, yüzey suları üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemek amacıyla kesinlikle yasak olacaktır. Kirletici maddeler, katı atıklar ile toksik veya tehlikeli maddeler su kütlelerine depolanmayacak, dökülmeyecek ve seyreltilmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla su kütlelerine verilmeyecektir. - İnşaat araçları ve makineleri, yalnızca yüzey sularını kirletmeyecek şekilde belirlenmiş alanlarda yıkanacaktır. İnşaat sahasında oluşan atık su, mümkün olması halinde kanalizasyon sistemine bağlanacak ve yerel yetkili kurumlar tarafından onaylanacaktır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, 19.03.1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Lâğım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak atık sular geçirimsiz fosseptik tanklarda toplanacaktır. Geçici fosseptik tanklı tuvaletler de bu amaçla kullanılabilir. Fosseptik tanklarda biriken atık sular periyodik olarak vidanjörlerle uzaklaştırılacak ve bertaraf işlemleri, lisanslı atık su arıtma tesisine (AAT) sahip ilgili belediye ile yapılacak protokol kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu protokol İPKB’ye sunulacaktır. - Yürütülecek faaliyetler, içme ve hijyen amaçlı su teminini		X		Kontrol önlemlerinin görsel denetimi Foseptik tank atık bertaraf kayıtları (varsa) Atık su kalite ölçüm kayıtları (varsa) Şikayet kayıtları	X			Yüklenici (<i>Uygulama</i>) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	olumsuz etkilemeyecektir. - Doğal su akışları engellenmeyecek veya başka yönlere yönlendirilmeyecek; nehir yataklarının kurumasına ya da yerleşim alanlarının su baskınına uğramasına neden olunmayacaktır. - Su yolları içerisinde yapılacak beton çalışmaları ayrı olarak yürütülecek ve su yollarına ulaşan drenajdan beton karışımının ayrıştırılması sağlanacaktır.								
Toprak ve Yeraltı Suyu Kalitesi: Yanlış atık yönetimi ve kazara dökülmeler nedeniyle toprak ve yeraltı suyu kirliliği ile toprak erozyonu	"Katı ve Tehlikeli Atıklar" bölümünde belirtilen azaltma önlemlerini uygun atık yönetimi için uygulayın. Beton mikserlerdeki kalıntı (dışarıda bırakılmış) betonun inşaat alanına, çevresine veya inşaat alanlarının erişim yollarına yıkanmasına izin verilmeyecektir. İlgili eğitimler beton mikser sürücülerine verilecektir. - Tehlikeli kimyasallar ve malzemeler, dökülme ve devrilmeyi önlemek amacıyla belirlenmiş depolama alanlarında sabitlenecektir. - Yarı kullanılmış kimyasal içeren kapların kapakları kapalı tutulacak ve kullanılmadıkları süre boyunca sıkıca kapatılacaktır. - Herhangi bir tehlikeli madde veya tehlikeli atık dökülmesi durumunda, ADMP’de belirtilen dökülme önleme yöntemleri uygulanarak maruziyet alanı sınırlandırılacaktır. Bu tür olaylara müdahale edecek çalışanların, dökülmelere acil müdahale konusunda gerekli eğitimleri almış olması sağlanacaktır. - Uygun dökülme kitleri, inşaat alanı içerisindeki uygun noktalara yerleştirilecektir. - Uygun olduğu durumlarda, inşaat faaliyetleri kuru sezon boyunca planlanacaktır. - Eğimlerin uzunluğu ve dikliği azaltılacak ve mümkün olan en düşük seviyede tutulacaktır. - İşlerin tamamlanmasını takiben alanlar üst toprak ile örtülecek ve		X		Kontrol önlemlerinin görsel denetimi Olay kayıtları Eğitim kayıtları Şikayet kayıtları	X			Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	ot, hızlı büyüyen bitkiler, çalılar veya ağaçlar kullanılarak inşaat alanlarının hızlı bir şekilde yeniden bitkilendirilmesi sağlanacaktır.								
Atık Yönetimi İnşaat faaliyetleri nedeniyle oluşan atıkların (örneğin inşaat yıkım atıkları, tehlikeli atıklar, biyobozunabilir atıklar, geri dönüştürülebilir atıklar, tehlikeli olmayan atıklar vb.) uygunsuz yönetiminden kaynaklanan ÇSG riskleri.	- Hafriyat, toprak, inşaat ve yıkım atıkları döküm izni belediyeden alınmalıdır. - Hafriyat atıkları, mümkün olduğunca dolgu amacıyla yeniden kullanılacak; geri kazanım ve diğer yeniden kullanım seçenekleri uygun şekilde değerlendirilecektir (asbest veya asbest içeren atıklar hariç). - Yıkım ve inşaat faaliyetleri sırasında malzemelerin geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması sağlanarak, ham doğal kaynaklara olan talep azaltılacak ve sürdürülebilir yönetim uygulamaları desteklenecektir. - Fazla hafriyat atıkları, lisanslı taşıma araçları kullanılarak ilçe/bölge sınırları içerisindeki mevcut lisanslı hafriyat atığı depolama alanlarına taşınacak ve bertaraf edilecektir. - Atıkların nihai bertaraf öncesinde (temeller için kazılan toprak dâhil) sahada depolanması, nehirler, dereler, göller ve sulak alanlardan en az 300 metre uzaklıkta olacak şekilde sağlanacaktır. - Her bir inşaat alanı hizmet dışı bırakıldıktan sonra, alandaki tüm enkaz ve atıkların temizlenmesi sağlanacaktır. - Atık oluşumu ve bertarafına ilişkin kayıtlar düzenli olarak tutulacaktır.	X	X		Kontrol önlemlerinin görsel denetimi Atık oluşumu ve bertaraf kayıtları Eğitim kayıtları Şikayet kayıtları	X			Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)
	- Atıklar, atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak (önleme, azaltma, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf) yönetilecek ve personelin atık yönetimi konusunda farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler verilecektir. - Tüm tehlikeli veya toksik maddelerin sahada geçici olarak depolanması, Malzeme Güvenlik Veri Formu (MSDS) uyarınca etiketlenmiş, güvenli kaplar içerisinde yapılacaktır; kaplarda bileşim, özellikler ve işlem bilgilerine ilişkin detaylar yer								

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	alacaktır. - Atıklar, geri dönüştürülebilir, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak ayrıştırılacaktır. - Tehlikeli olmayan atıklar, inert ve biyobozunabilir atıklar ile geri dönüştürülebilir atıklar ayrı ayrı toplanacak; sızdırmaz kaplar kullanılacak ve tehlikeli atıkların diğer atıklarla karışması durumunda dökülme ve sızıntıyı önlemek için özel özen gösterilecektir. - Atıklar, uygun şekilde belirlenmiş ve kontrollü lisanslı bertaraf alanlarına/tesislerine (örneğin kazı atığı depolama alanları, düzenli depolama sahaları, geri dönüşüm/geri kazanım tesisleri vb.) toplanacak, depolanacak ve taşınacaktır. Bu atıkların lisanslı alanlarda kabul edileceğini belirten resmi yazı İPKB'ye sunulacaktır. - İnşaat alanında kurulacak geçici atık depolama alanı geçirimsiz zemin üzerinde yer alacak, çatı ile kaplı olacak ve uygun drenaj sistemi, dökülme kitleri ile yangın söndürme ekipmanlarıyla donatılacaktır. Atıklar, birbirleriyle reaksiyona girmemeleri için türlerine göre ayrı bölmelerde ve atık kodları ile etiketlenmiş şekilde geçici olarak depolanacaktır. Tehlikeli atıklar en fazla altı (6) ay, tehlikesiz atıklar ise en fazla bir (1) yıl süreyle depolanacaktır. - Tehlikeli atıklar, lisanslı atık taşıma firmaları aracılığıyla lisanslı bertaraf tesislerine; geri dönüştürülebilir atıklar ise ilgili lisanslı geri dönüşüm/geri kazanım tesislerine gönderilecektir. Tüm protokoller ve atık kayıtları İPKB'ye sunulacaktır. - Çalışanlar, yakıt ve diğer maddelerin doğru transferi ve kullanımı konusunda eğitilecek; yüksek tehlike içeren maddelerle çalışırken eldiven, bot, önlük, gözlük ve diğer uygun kişisel koruyucu donanımların kullanımı zorunlu tutulacaktır.								
Paydaş Katılımı ve	PKP'de önerilen ilgili önlemler takip edilecektir.	X	X		Şikayet		X		İPKB

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
Şikâyet Mekanizması İnşaatla ilgili şikâyetler ve uygun mülk sahipleri dahil yerel topluluğa geçici aksaklıklar	- Erken ve etkili iletişim, yüklenici ve Müşavir tarafından çalışmalardan etkilenebilecek kişilerle sağlanacaktır. - Yerel çevre ve konutlara yönelik sürekli bir iletişim ve karşılıklı saygı programı oluşturulacaktır. Müşavir, toplumla iletişimi sağlamak üzere, ilgili bilgileri sunacak ve endişe verici hususların ele alınmasında ilk temas noktası olarak görev yapacak kişi veya kişiler atayacaktır. - Proje Şikâyet Mekanizması, şikâyet formlarının alınması ile açılması ve sonuçlandırılması süreçleri yoluyla uygulanacaktır. - Çalışmaların denetimi ve yönetiminden sorumlu tüm saha personelinin isimleri, iletişim telefon numaraları ve e-posta adresleri saha bilgi panosunda gösterilecektir. - Planlama izninin alınmasının ardından mahalle muhtarı ile resmi temas kurulacak ve inşaatın etkilenebilecek kişiler muhtar aracılığıyla bilgilendirilecektir. Bu süreç, ilgili Ç&S risk yönetimi araçları kapsamında danışmayı ve günün özellikle hassas saatlerinin belirlenmesini içerecektir. - Normal çalışma saatleri dışında, güvenlik personeli özel bir telefon numarası aracılığıyla ana iletişim noktası olarak görev yapacak ve gerekli durumlarda (24 saat esasına göre) yetkili iletişim sorumlusu kişi veya kişileri bilgilendirecektir. Tüm çalışanlar, sosyal uyum ile Cinsel İstismar ve Cinsel Taciz (SEA/SH) risklerine ilişkin olası olumsuz etkilerin yönetilmesi amacıyla Davranış Kuralları'nı imzalayacak/taahhüt edecek ve kendilerine ilgili eğitimler verilecektir. - Alınan tüm şikâyetler kaydedilecek, eksiksiz şekilde incelenecek ve mümkün olan en kısa sürede yanıtlanarak alınan önlemler hakkında geri bildirim sağlanacaktır. Şikâyet kayıtları Müteahhit, Eğitim Danışmanı, Müşavir ve İPKB'ye bildirilecektir. Planlama ve inşaat aşamalarında saha girişlerinde kamuya				kayıtları Paydaş katılım kayıtları				Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	açık duyuru panoları kurulacak; bu panolar çevresel konular dâhil olmak üzere gerekli iletişim bilgilerini içerecektir.								
İşgücü ve Çalışma Koşulları: Potansiyel iş gücü akışıyla ilişkili riskler (örneğin çocuk işçiliği riskleri, cinsiyete dayalı şiddet ve taciz, insan hakları riskleri vb.) ve diğer İşçi Sorunları	• Proje İYP'ye uygun olarak Yüklenici tarafından hazırlanacak İşçi Yönetim Planı'ndaki (İY Planı) ilgili önlemler takip edilecektir. • İşçilere, ulusal iş ve istihdam hukuku kapsamında sahip oldukları haklar (geçerli toplu iş sözleşmeleri dâhil) ile istihdam şart ve koşullarına ilişkin açık, anlaşılır bilgi ve belgeler sağlanacaktır. • İşçilere, ulusal mevzuat ve proje İYP'si hükümlerine uygun olarak düzenli ödeme yapılacaktır. • Çalışanlara, ulusal mevzuat ve proje İYP'si gereğince haftalık yeterli dinlenme süreleri ile yıllık izin, hastalık izni, doğum ve aile izinleri verilecektir. • İşçilere, iş akdinin feshi durumunda yazılı bildirim ve kıdem tazminatına ilişkin bilgiler zamanında sağlanacaktır. • İşçiler, eşit fırsat ve adil muamele ilkesi doğrultusunda istihdam edilecek; iş ilişkisinin hiçbir aşamasında ayrımcılık yapılmayacaktır. • Proje çalışanları, kadınlar, engelliler ve göçmen işçiler dâhil olmak üzere, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi'nin ÇSS2'si ile uyumlu koruma ve destek önlemlerinden yararlanacaktır. Bu süreç proje İYP'sine uygun şekilde yürütülecektir. • İşçilerin, işçi örgütlerine katılmalarına ve toplu pazarlık ya da alternatif mekanizmalara dâhil olmalarına izin verilecektir. • 18 yaşından küçük çocuklar, bu alt proje kapsamında Yüklenici tarafından istihdam edilmeyecek veya işe alınmayacaktır. • Zorla çalıştırma kapsamında değerlendirilen, tehdit veya ceza tehdidi altında zorla yaptırılan herhangi bir iş veya hizmet, bu alt proje ile bağlantılı olarak kullanılmayacaktır. • Proje sahasında herhangi bir faaliyete başlanmadan önce,				Kontrol önlemlerinin görsel denetimi Sağlık kayıtları Çalışan kayıtları Eğitim kayıtları İşçi şikayetlerini n kayıtları	X			Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
	Müteahhit tarafından çalışanların işyeriyle ilgili şikâyet ve taleplerini iletebileceği bir işçi şikâyet mekanizması oluşturulacaktır. Bu mekanizmaya ilişkin iletişim bilgileri işe başlama eğitimleri sırasında çalışanlara bildirilecektir. - Tüm çalışanlara, işe alım sürecinde ve çalışmaya başlamadan önce, ulusal iş ve istihdam mevzuatı kapsamındaki hakları ile işçi şikâyet mekanizmasına ilişkin eğitim verilecektir. - Davranış Kuralları, istihdam sürecinde proje çalışanlarıyla paylaşılacak; tüm çalışanların bu kurallara uymayı kabul ederek ilgili belgeleri işe girişte imzalaması sağlanacaktır. - İnşaat alanına giriş ve çıkışlar kontrol altında tutulacak ve sahaya yetkisiz erişim engellenecektir. - Yüklenici, çalışanların işe başlamadan önce işe uygunluklarını doğrulayacak; özellikle sağlık sorunu bulunan veya risk altında olabilecek çalışanlara gerekli özeni gösterecektir. - Yüklenici, çalışanlara bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları sağlayacaktır. - Yüklenici, işçiler için güvenli içme suyu, her iki cinsiyet için yeterli ve uygun tuvalet imkânları ile konaklama, dinlenme ve yemek alanları sağlayacaktır. Yüklenici, bandaj, antibiyotik krem vb. malzemeleri içeren ilk yardım kitleri bulunduracak; tıbbi acil durumlarda müdahale edebilmek üzere yeterli sayıda çalışanı ilk yardım konusunda eğitecektir.								
Kültürel Miras Şans Eseri Buluntu	- Yerel yönetimler, ilgili kültürel miras kuruluşları ve topluluklarla etkili iletişim kurulacak; bu iletişim, kültürel miras unsurlarının uygun ve doğru şekilde ele alınmasını sağlayacaktır. - Kültürel veya tarihi alanlara zarar verilmemesi sağlanacaktır. - İnşaat çalışmaları sırasında (özellikle kazı ve toprak işleri) herhangi bir kültürel miras/varlıkla karşılaşılsa, şans eseri buluntu prosedürü uygulanacaktır (bkz. proje ÇSYÇ Ek 4).	X	X		Şans eseri buluntu kayıtları		X		İPKB Yüklenici (<i>Uygulama</i>) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Potansiyel Riskler ve Etkiler	Önerilen Azaltma Önlemleri	Faz			İzleme için göstergeler	İzleme Sıklığı			Uygulama ve izleme sorumluluğu
		Planlama	İnşaat	İşletme		Sürekli	Aylık	Çeyrek	
Biyolojik çeşitlilik: İnşaat faaliyetleri ve yanlış atık yönetimi nedeniyle flora ve fauna için potansiyel riskler	- Planlı Alanlar Geliştirme Yönetmeliği'ne (03 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış, 30113 numaralı ve Ek: RG-31/12/2022-32060) uygun olarak; konut, ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve spor alanları için bina alanı dışındaki 30 m² alana 1 ağaç dikilmesi sağlanmalıdır. Parselde ekim mümkün değilse, imar planlarına göre belirlenmiş kamu alanlarına ağaçlar dikilmelidir - Ağaç dikimi ve peyzaj projelerinde yangına dayanıklı yerli bitki türlerinin kullanımı, kentsel ısı adası etkilerini hafifletirken ekolojik işlevleri desteklemektedir.		X		Ağaç dikme kayıtları Tarama Kontrol önlemlerinin görsel denetimi			X	Yüklenici (Uygulama) Müşavir (Kontrol)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

6. Roller ve Sorumluluklar

Projeye özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu taraflar şu adreste sunulmaktadır: Tablo 2.

Tablo 2 Roller ve Sorumluluklar

• Sorumlu Taraf	• Roller ve Sorumluluklar
• İPKB	• Proje gereksinimlerine uygun olarak çevresel, sosyal ve İSG risklerinin etkin yönetimi ve izlenmesini sağlamak için bir çevre, bir sosyal ve bir İSG uzmanı işe almak/atanmak. • Çevre, sosyal ve İSG uzmanları aracılığıyla; - Proje hedefleri, çevresel ve sosyal gereksinimler ile paydaş beklentileriyle uyumu sağlamak için yerel yönetimler, yükleniciler ve toplum liderleriyle yakın koordinasyon sağlamak. - Çevresel ve sosyal azaltma önlemlerinin uygulanmasını, şikayetleri ve izleme verilerini takip etmek amacıyla merkezi bir veri tabanı geliştirmek ve sürdürmek; bu sayede Dünya Bankası ve diğer paydaşlara raporlama için güncel ve erişilebilir bilgi sağlamak. - Çevresel ve sosyal risk yönetimi üzerinde çalışan saha personeli ve yükleniciler için denetim, destek ve kalite kontrolü sağlamak. - Alt projelerin Harici Listesi (ÇSYÇ Tablo 5) ile karşılaştırıldığından emin olmak. - Her bir alt proje için Ç&S Tarama Formlarını hazırlamak ve onay için DB'ye sunmak. - ÇSYP gerektiren faaliyetler için, proje düzeyindeki ÇSYP'yi (proje ÇSYÇ Ek 3) özelleştirerek sahaya özgü ÇSYP'ler hazırlamak ve en az ilk beş (5) ÇSYP'yi önceden incelemeye sunmak; açıklama ve danışma amacıyla DB tarafından itiraz edilmemesini sağlamak. - İhale süreci başlatılmadan önce DB onaylı projeye özgü ÇSYP'ler hakkında danışmak ve açıklama yapmak; danışma süreci ardından, projeye özel ÇSYP'leri güncelleyerek geri bildirim sonuçlarını dahil etmek ve bunları ihale amacıyla DB'nin onayına sunmak. - Tüm ihale, ihale ve sözleşme belgelerinde ilgili Ç&S yönetim hükümleri ve ilgili Ç&S araçlarına (örneğin ÇSYP, PKP, İYP vb.) referanslar içerdiğinden emin olmak. - İlgili ihale belgelerine sahya özgü ÇSYP'lerin eklenmesini sağlamak. • Merkezi ve saha personeli ile yüklenicileri ÇSYÇ ve ilgili planların uygulanması konusunda eğitmek. • İnşaat çalışmalarına başlamadan önce, yüklenici tarafından hazırlanacak Y-ÇSYP, İY Planı ve Ç&S alt yönetim planları şekilde incelemek ve onaylamak; alt proje uygulama süresi boyunca bu planların uygulanmasını sağlamak. - İnşaat sahalarının Ç&S performansını aylık olarak ziyaret etmek ve izlemek, ayrıca devlet kurumlarıyla tüm yazışmaları yürütmek. - Bir şikayet mekanizması kurup sürdürmek ve şikayetleri her seviyede çözmek. - Herhangi bir ciddi Ç&S olayını 48 saat içinde Dünya Bankası'na bildirmek ve 10 gün içinde kök neden analizi ile düzeltici önlemlerle birlikte olay raporları sunmak - Çevresel ve sosyal etki azaltma önlemlerinin uygulanmasını ve izlenmesini denetlemek.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

	- İlerlemelerin dokümantasyonunu tutmak ve üç aylık olarak Dünya Bankası'na sunulmak üzere raporlar hazırlamak.
• Denetim Danışmanları (İnşaat)	• Çevre, sosyal ve sağlık ve güvenlik (ÇSSG) azaltma önlemlerinin günlük uygulanması ve izlenmesi ve alt projelerin ilerlemesi ile ÇSSG performansını uygulayıcı İPKB'ye aylık olarak rapor etmek. • Yüklenicilerin mevzuat, saha özel ÇSYP'ler ve ilgili Ç&S alt yönetim planlarına uymasını sağlamak. • Müşavirin Görev Şartlarında tanımlanan uygulama düzenlemeleri ve alt projenin özel ihtiyaçları doğrultusunda, ilgili sertifika ve/veya deneyime sahip bir İSG uzmanı ve bir Çevre ve Sosyal Uzmanın Ç&S yönetiminden sorumlu olmasını sağlamak. • Ç&S azaltma önlemlerinin uygulanmasının günlük yerinde izlenmesi, Mütahhitin atadığı Ç&S personeli tarafından gerçekleştirilecek ve Müşavir tarafından düzenli saha ziyaretleriyle doğrulanacaktır. İPKB, IRP ÇSYÇ'nin 5.1.c Bölümünde sunulan saha kayıtlarının, denetim raporlarının ve aylık konsolide Ç&S performans raporlarının incelenmesi yoluyla denetim yapacaktır. • Sahada herhangi bir inşaat çalışmasına başlamadan önce, İPKB ile koordinasyon içinde, yüklenici tarafından hazırlanan Y-ÇSYP, İY Planı ve Ç&S alt yönetim planlarını inceler ve onaylar ve alt proje uygulama süresince bunların uygulanmasını sağlar. Tüm onaylanmış belgeler 5 iş günü içinde İPKB'ye sunulacaktır. İPKB tarafından tespit edilen eksiklikler veya uyumsuzluklar, süpervizör tarafından yükleniciye bildirilecek ve yüklenici bunları 15 iş günü içinde gidermek zorunda kalacaktır. • Mütahhitlere Ç&S ve İSG önlemleri konusunda eğitim vermek. • İPKB ile yakın iş birliği içinde, PKP'nin saha düzeyinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak. • İlgili olduğunda, paydaşlardan gelen şikayetleri ele almak. • İPKB'yi ciddi Ç&S (İSG dahil) olayları hakkında derhal bilgilendirmek.
• Mütehitler	• Herhangi bir inşaat çalışması başlamadan önce, Y-ÇSYP, İY Planı ve ilgili Ç&S alt yönetim planlarını hazırlayın ve bu belgeleri İPKB'ye inceleme ve onay için teslim etmek. • IRP ÇSYÇ'de tanımlanan ve bu ÇSYP'nin Tablo 1 ve Tablo 3'ünde yansıtılan personel düzenlemelerine uygun olarak, Ç&S yönetiminden sorumlu olacak şekilde bir tam zamanlı İSG uzmanı ile ilgili sertifikaya ve/veya deneyime sahip tam zamanlı bir Çevresel ve Sosyal Uzman istihdam edilmesini sağlamak. • Y-ÇSYP, İY Planı ve ilgili Ç&S alt yönetim planları ile sözleşme belgelerinde belirtilen Projenin çevresel ve sosyal azaltma önlemlerinin uygulanması ve uyumunu sağlamak ve ulusal ve yerel mevzuata uyumu sağlamak. • Proje PKP'de tanımlanan ŞM prosedürüne uygun olarak inşaatla ilgili şikayetleri ele almak ve çözülmemiş sorunları derhal Denetim Danışmanları/İPKB'ye iletmek. • Ciddi Ç&S olayları durumunda hemen Müşaviri/İPKB'yi bilgilendirmek. • Saha faaliyetlerini günlük olarak izlemek ve Ç&S performansını aylık olarak denetim danışmanlarına/İPKB'ye rapor etmek. • İş gücüne düzenli eğitim ve kapasite geliştirme oturumları sunmak; bu kapsamda, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ç&S risk yönetimi konularında (İşçi Yönetim Planı kapsamında işçi hakları ve yükümlülükleri, Paydaş Katılım Planı gerekliliklerine dayalı paydaş katılımı uygulamaları, Acil Durum Müdahale Planı, İSG planı, toplum sağlığı ve güvenliği ile trafik yönetim planı, atık yönetim planı, Davranış Kuralları vb.) eğitimler sağlamak.

7. Kapasite Geliştirme ve Eğitim

Yüklenici, tüm proje çalışanları ve ilgili paydaşlar için yapılandırılmış bir eğitim programı tasarlayacak ve uygulayacaktır. En azından, aşağıdaki eğitimler periyodik olarak verilecek ve tekrarlanacaktır:

- Çevre ve Sosyal Yönetim ile İş Sağlığı ve Güvenliği Başlangıç Eğitimi – tüm çalışanlar için sahada faaliyetlere başlamadan önce.
- Saha Erişimi ve Oryantasyon Eğitimi – ziyaretçiler için indüksiyon ve yeni başlayan çalışanlar için oryantasyon eğitimini kapsayacak şekilde.
- Trafik ve Yaya Güvenliği Eğitimi – ağır araçların hareketi, güvenli yaya geçişleri ve topluma duyarlı sürüş uygulamalarını kapsar.
- Davranış Kuralları Eğitimi – saygılı işyeri uygulamaları, cinsel tacizin önlenmesi ve yerel topluluklarla etkileşim ele alınması.
- Cinsiyete Dayalı Şiddet (GBV), Cinsel İstismar ve İstismar/Cinsel Taciz (SEA/SH) Eğitimi – farkındalık, önleme ve mağdur odaklı müdahaleye odaklanıyor.
- Atık Yönetimi Eğitimi – yapı ve tehlikeli atıkların ayrılması, depolaması, taşınması ve güvenli şekilde işlenmesi.
- Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Eğitimi – yangın güvenliği, tahliye tatbikatları, dökülme müdahalesi ve ilk yardım dahil.
- Olay ve Kaza Raporlama Eğitimi – anında bildirim, kök neden analizi ve düzeltici önlemler için prosedürler.
- Şikayet Mekanizması (ŞM) Eğitimi – çalışanların ve toplum üyelerinin ŞM sistemine nasıl erişebileceği ve kullanabileceği.
- Paydaş Katılımı ve İletişim Eğitimi – Ç&S personeli ve amirleri için yerel topluluklarla anlamlı etkileşim sağlamak amacıyla.

Yüklenici, bu eğitimlerin organizasyonu ve finansmanından sorumludur; ister iç kaynaklar kullanılarak, ister sertifikalı dış sağlayıcılar aracılığıyla gerçekleştirilsin, yüklenici tarafından sağlanacaktır.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

8. Uygulama Takvimi ve Maliyet Tahminleri

Proje boyunca uygulanacak azaltma ve kapasite geliştirme önlemleri için gösterge maliyet takvimi hazırlanmıştır.

Tablo 3 Gösterge ÇSYP Uygulama Bütçesi¹

Aktivite/Maliyet Ögesi	Potansiyel Maliyet (USD)
Tam Zamanlı Çevre, Sosyal ve İSG Danışmanları	80.000,00 USD
İzleme / Saha Ziyaretleri / Y-ÇSYP Hazırlığı	10.000,00 USD
Eğitimler, Farkındalık, Kapasite Geliştirme	15.000,00 USD
PKP ve ÇSYP Önlemlerinin Uygulanması	10.000,00 USD
Bulaşıcı Hastalıkların Önlemesi	5.000,00 USD
TOPLAM	120.000,00 USD

¹ Bu gösterge maliyetleri Proje bütçesi kapsamında karşılanır ve planlama amaçları için sağlanır. Yükleniciler, tekliflerinde kendi uygulama maliyetlerini yansıtmalıdır.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

9. Paydaş Katılımı ve Şikayet Mekanizması

Paydaş katılımı, Proje yaşam döngüsü boyunca uygulanacak kapsayıcı ve sürekli bir süreçtir. Güçlü, yapıcı ve yanıt verebilir çalışma ilişkilerinin kurulmasını destekler ve Projenin çevresel ve sosyal (Ç&S) risk ve etkilerinin başarılı yönetimi için hayati öneme sahiptir.

İstanbul Dirençlilik Projesi (IRP) kapsamında, potansiyel olarak etkilenen veya doğrudan fayda sağlayan binaların yönetimi ve kullanıcıları dahil olmak üzere paydaşlarla yapılandırılmış etkileşimi yönlendirmek için bir Paydaş Katılım Planı (PKP) hazırlanmıştır. PKP, paydaş beklentileri ve risklerinin yönetimini kolaylaştırır, potansiyel çatışmaları ve gecikmeleri azaltmaya yardımcı olur ve erken, sık ve şeffaf iletişimi sağlar.

PKP ayrıca, etkilenen kişilerin endişelerini, önerilerini ve şikayetlerini dile getirebilmeleri için erişilebilir ve kapsayıcı araçlar oluşturur; böylece İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) ve diğer sorumlu kurumlar sorunlara etkili bir şekilde yanıt verip yönetebilir.

Proje hazırlığı sırasında, kamu kurumları, yerel yönetimler, okul yönetimleri, öğretmenler, veliler ve toplum üyelerinden temsilcilerle istişare toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılarda, Projenin finansman kaynakları, hedefleri, bileşenleri ve bina seçimi için uygunluk kriterleri sunulmuştur. Katılımcıların endişeleri, soruları ve geri bildirimleri belgelenmiş ve PKP'de yansıtılmıştır.

Bu sahaya özgü ÇSYP'nin taslak versiyonunun 3 Ağustos 2026 tarihinde açıklanmasının ardından, alt projeye ilişkin olarak 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 10:00'da bir bilgilendirme ve halkın katılımı toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı, İstanbul ili Beykoz ilçesi Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Ağlayan Gelin Sokak No: 6 adresinde bulunan Celal Aras Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilmiş ve IRP'nin paydaş katılımı ve bilgi açıklama standartları doğrultusunda düzenlenmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, alt projenin yararlanıcı kurumu olan İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla, Ek 6'da sunulan resmi yazı ile resmi olarak iletilmiştir. Ayrıca, daha geniş kapsamlı paydaş bilgilendirmesi ve katılımının sağlanması amacıyla, Ek 7'de gösterildiği üzere, 3 Ağustos 2026 tarihinde İPKB'nin resmi internet sitesinde bir kamuoyu duyurusu yayımlanmıştır.

İstişare toplantısına Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürü, Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü, okul müdürleri, Çengeldere ve Çavuşbaşı mahalle muhtarları, öğretmenler, bir öğrenci temsilcisi ve yerel halk katılım sağlamıştır. Toplantıya, etkinlik için hazırlanan katılımcı listesine göre 13 kadın ve 12 erkek olmak üzere toplam 25 kişi katılmıştır. Toplantı kayıtları, bu sahaya özgü ÇSYP'nin Ek 8'inde sunulmaktadır.

Toplantı sırasında katılımcılara IRP ve bu sahaya özgü ÇSYP'nin temel çevresel ve sosyal hususları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, İPKB mimarı ve tasarım danışmanı tarafından; vaziyet planı, bina konumları, erişim ve sirkülasyon düzenlemeleri, kat planları, yangın acil durum kaçış güzergâhları, avlu düzenlemeleri ve aynı parsel üzerinde yer alan iki okul binası arasındaki ilişkiyi içeren proje görselleri sunulmuştur. Sunum kapsamında ayrıca, binaların acil durumlar sırasında işlevlerini sürdürebilmelerini desteklemek amacıyla tasarlanan kendi kendine yeterlilik ve sürdürülebilirlik tedbirleri de dâhil olmak üzere, binaların yeni teknik ve dayanıklılığı artırıcı özellikleri ele alınmıştır. Alt projeye özgü ÇSYP bilgilendirmesinde ve proje tasarım sunumunda kullanılan sunum materyalleri sırasıyla Ek 9 ve Ek 10'da sunulmaktadır. Bilgilendirme ve istişare toplantısı sırasında çekilen fotoğraflar ise Ek 11'de sunulmaktadır.

Katılımcılar tarafından, ağırlıklı olarak öngörülen inşaat ve işletme takvimine, eski okul binasının yıkılmasının ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin geçici olarak başka okullarda eğitim görmeye devam ettiği sürenin uzamasına ilişkin endişelere, okul bahçesinin büyüklüğü ve işlevsel kullanımına, önerilen açık hava basketbol sahasına, oturma ve sosyal alanlara, terasın olası kullanımına, araç park düzenlemelerine, alanın iki okul tarafından ortak kullanımına, ayrı giriş ve çıkış düzenlemelerine,

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

sahanın eğimli topoğrafyasından kaynaklanan tasarım kısıtlarına, öğrenci kapasitesine ve müzik odasının büyüklüğü ile akustik yalıtımına ilişkin çeşitli soru, görüş ve öneriler dile getirilmiştir.

Öngörülen uygulama takvimi ile inşaatın başlayabilmesi öncesinde tamamlanması gereken idari ve ihale süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Öğrencilerin ve öğretmenlerin geçici olarak başka okullarda eğitim görmeye devam ettiği sürenin uzamasına ilişkin endişelere cevaben, İPKB tarafından inşaat aşamasında önlenabilir gecikmelerin önüne geçilmesi amacıyla sıkı kontroller uygulanacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, inşaat faaliyetlerinin kapsamı dışında kalan idari süreçlerin ilgili kurumların sorumluluğunda olduğu da açıklanmıştır. Önerilen öğrenci kapasitesi ve binaların mekânsal organizasyonu da sunulmuş; tasarımın, sahanın fiziksel ve topoğrafik kısıtları, geçerli eğitim tesisi standartları, erişilebilirlik gereklilikleri ile yangın ve can güvenliği hükümleri dikkate alınarak geliştirildiği açıklanmıştır.

Diğer görüşler, okul bahçesinin yeterliliği ve işlevsel kullanımı, önerilen açık hava basketbol sahası, oturma ve sosyal alanlar ile araç park düzenlemelerine ilişkin olmuştur. Katılımcılar ayrıca, parselin iki okul tarafından ortak kullanımı konusunda sorular yöneltmiş ve güvenli ve düzenli sirkülasyonu desteklemek amacıyla ayrı giriş ve çıkış düzenlemelerinin değerlendirilmesini talep etmiştir. Bu görüşler tasarım danışmanı tarafından not edilmiş olup, uygulanabilir tasarım kriterleri, saha kısıtları, güvenlik gereklilikleri ve ilgili kurumsal onaylar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Katılımcılar ayrıca, teras alanının olası işlevsel kullanım açısından değerlendirilmesini önermiştir. Tasarım danışmanı bu öneriyi not etmiş olup, güvenlik, erişilebilirlik, işletme gereklilikleri, geçerli mevzuat ve binaların genel tasarımı dikkate alınarak teknik uygulanabilirliğini ve uygunluğunu inceleyip değerlendirecektir. Müzik odasına ilişkin sorulara cevaben ise, planlanan müzik odasının yaklaşık 50 m² alana sahip olduğu ve tasarıma uygun akustik yalıtım tedbirlerinin dâhil edildiği açıklanmıştır.

Genel olarak geri bildirimler; uygulama takvimine, inşaat süresince eğitimin devamlılığının sağlanmasına, okul bahçesi ve sosyal alanların etkin kullanımına, güvenli erişim ve sirkülasyona, alanı paylaşan iki okul arasındaki koordinasyona, otopark düzenlemelerine, öğrenci kapasitesine ve eğitim alanlarının işlevselliğine odaklanmıştır. Toplantı sırasında alınan görüş ve öneriler, devam eden tasarım inceleme ve uygulama süreçlerinde değerlendirilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

İstişare toplantısı sırasında gündeme getirilen temel hususlar proje ekibi tarafından sistematik olarak değerlendirilmiş olup, uygun ve teknik olarak uygulanabilir olduğu değerlendirilen hususlar, proje yaklaşımına ve nihai tasarıma ilişkin değerlendirmelere dâhil edilecektir. Tüm sorular, proje ekibi ve tasarım danışmanı tarafından toplantı sırasında yanıtlanmış; açıklamalar, geçerli mevzuat, kurumsal sorumluluklar, güvenlik gereklilikleri, saha kısıtları ve projenin kapsamı doğrultusunda yapılmıştır. Uygun görülen hususlarda, tasarım ve uygulama aşamalarında koordinasyonun sürdürülmesini desteklemek amacıyla; okul bahçesi düzenlemelerinin, açık hava basketbol sahasının, oturma ve sosyal alanların, araç park düzenlemelerinin, ayrı giriş ve çıkış düzenlemelerinin ve önerilen teras kullanımının teknik uygulanabilirliği ve uygunluğunun değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere takip edilmesi gereken eylemler belirlenmiştir. Genel olarak, alt projeye yönelik herhangi bir itiraz dile getirilmemiş ve paydaşlar; eğitimin sürekliliğinin sağlanmasının, güvenli erişim ve sirkülasyonun, okul bahçesinin etkin kullanımının, iki okul arasında uygun koordinasyonun sağlanmasının ve güvenli ve işlevsel eğitim alanlarının oluşturulmasının önemini özellikle vurgulayarak, yeniden yapım projesine genel olarak destek göstermiştir.

Katılım çizelgeleri ve katılımcı kayıtları ıslak imza ile alınmış olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun olarak İPKB tarafından güvenli bir şekilde arşivlenmektedir. Söz konusu kayıtlar yalnızca proje dokümantasyonu, izleme ve denetim amaçları doğrultusunda muhafaza edilmekte olup kamuya açık şekilde paylaşılmamaktadır.

IRP kapsamında finanse edilen alt projelerle ilgili tüm şikayet veya taleplerin — yükleniciler, denetim personeli, bina kullanıcıları veya topluluk tarafından — zamanında, etkili ve adil şekilde ele alınmasını

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

sağlamak için özel bir Şikayet Mekanizması oluşturulmuştur. ŞM, aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi birden fazla erişilebilir kanal üzerinden çalışır:

Projeye Özel Kanallar (İPKB)

- **Yardım hattı (telefon):** +90 (216) 505 55 00 (çalışma saatlerinde)
- **E-posta:** info@ipkb.gov.tr
- **Posta Adresi:** İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad. No:6, 34692 Üsküdar/İstanbul
- **Yüz yüze:** Paydaşlar çalışma saatlerinde İPKB ofislerini ziyaret edebilir
- **Çevrimiçi Şikayet/Öneri Formu:** <https://www.ipkb.gov.tr/sikayet-formu/>
- **Sosyal Medya Kanalları:**
 - Twitter: <https://x.com/ipkbgovtr>
 - Facebook: <https://www.facebook.com/ipkbgovtr>
 - Instagram: <https://www.instagram.com/ismepipkb/>
 - LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/ipkb>
 - YouTube: <https://www.youtube.com/user/IPKBirimi>
- **Yerinde Şikayet/Öneri Kutuları:** Faaliyetler sahada başladıktan sonra proje alanlarında ve İPKB ofislerinde kurulacak, anonimlik ve gizlilik sağlanacaktır.

Ulusal Kanallar

- **CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi):**
 - Web Sitesi: www.cimer.gov.tr
 - Çağrı Merkezi: 150
 - Telefon: +90 (312) 590 20 00
 - Faks: +90 (312) 473 64 94
 - Posta: Türkiye Cumhuriyeti İletişim Direktörlüğü Başkanlığı
 - Yüz yüze: İl/bölge valilikleri ve bakanlıklar aracılığıyla
- **YİMER (Yabancılar İletişim Merkezi):**
 - Web sitesi: www.yimer.gov.tr
 - Çağrı Merkezi: 157
 - Telefon: +90 (312) 157 11 22
 - Faks: +90 (312) 920 06 09
 - E-posta: yimer@goc.gov.tr
 - Yüz yüze: Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü ofislerinde
- **İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) – Beyaz Masa (Beyaz Masa):**
 - Yardım hattı: 153 (İstanbul içinde)
 - Çevrimiçi: <https://beyazmasa.ibb.gov.tr/>

Dünya Bankası Kanalları

- **Dünya Bankası Şikayet Çözüm Servisi (GRS):**

Projeden etkilenen kişiler, Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir projeden olumsuz etkilendiklerini düşünürlerse doğrudan GRS'ye şikayet edebilirler.

- Web Sitesi: <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service>

- **Dünya Bankası Denetim Paneli:**

Dünya Bankası'nın politikalarına uymaması nedeniyle bir projeden zarar gördüğüne veya zarar görebileceğine inanan topluluklar ve bireyler, Denetim Paneli'ne şikayette bulunabilir. Panel, zarar olup olmadığını bağımsız olarak belirler ve doğrudan Banka ile iletişim kurar.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Bu kanallar üzerinden alınan tüm şikayetler, Projenin Şikayet Mekanizması Prosedürlerine uygun olarak kaydedilecek, takip edilecek ve yanıtlanacaktır. Şikayetlerin yönetimi için roller ve sorumluluklar PKP 7. Bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

10.Yüklenicinin Referans Belgeleri

Yüklenicinin, İstanbul Dirençlilik Projesi (IRP) kapsamında hazırlanan tüm Çevresel ve Sosyal (Ç&S) belgelerini kullanması beklenmektedir. Sözleşme verildikten sonra, Yüklenici İPKB uzmanları tarafından ilgili alt proje için taslak olarak hazırlanmış bu alana özgü Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı'nı (ÇSYP) daha da geliştirecek ve özelleştirecektir.

Ayrıca, Yüklenici ÇSYÇ eklerinde sunulan şablonlara dayanarak bu ÇSYP'nin 5. Bölümünde tanımlanan sahaya özgü alt yönetim planları hazırlayıp sunacaktır.

Bu planlar Müteahhit tarafından hazırlanacak ve inşaat faaliyetlerine başlamadan önce inceleme ve onay için İPKB'ye sunulacaktır.

Tüm ilgili şablon belgeler, Yüklenici için referans belgeleri olarak hizmet veren IRP Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) ve ekleri (*bkz.* IRP ÇSYÇ) aracılığıyla erişilebilir.

11.İnceleme ve Onay

HAZIRLAYAN: Hande GÜLCAN İPKB - Çevre Yüksek Mühendisi Tarih: 03/08/2026	
İNCELEME: Aslıhan AL İPKB – Şehir Plancısı/Sosyal Uzman Tarih: 03/08/2026	ONAYLAYAN: Burak REİS İPKB - Ç&S Yönetim Ekip Lideri Tarih: 03/08/2026

EKLER

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 1. Proje Alanı Fotoğrafları



Fotoğraf 1: Proje Alanı Girişi

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ



Fotoğraf 2-3: Proje Alanı

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ



Fotoğraf 4-5: Proje Alanı

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ



Fotoğraf 6-7: Proje Alanı Sınırı

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ



Fotoğraf 8-9: Proje Alanı ve Diğer Yapı – Spor Salonu (alt proje kapsamı dışında ve korunacak)

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ



Fotoğraf 10-11: Proje Çevre Alanı



İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ



Fotoğraf 12-13: Proje Alanı - Dron Fotoğrafları

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 2. Proje Alanı ve Çevresinin Havadan Görünümü

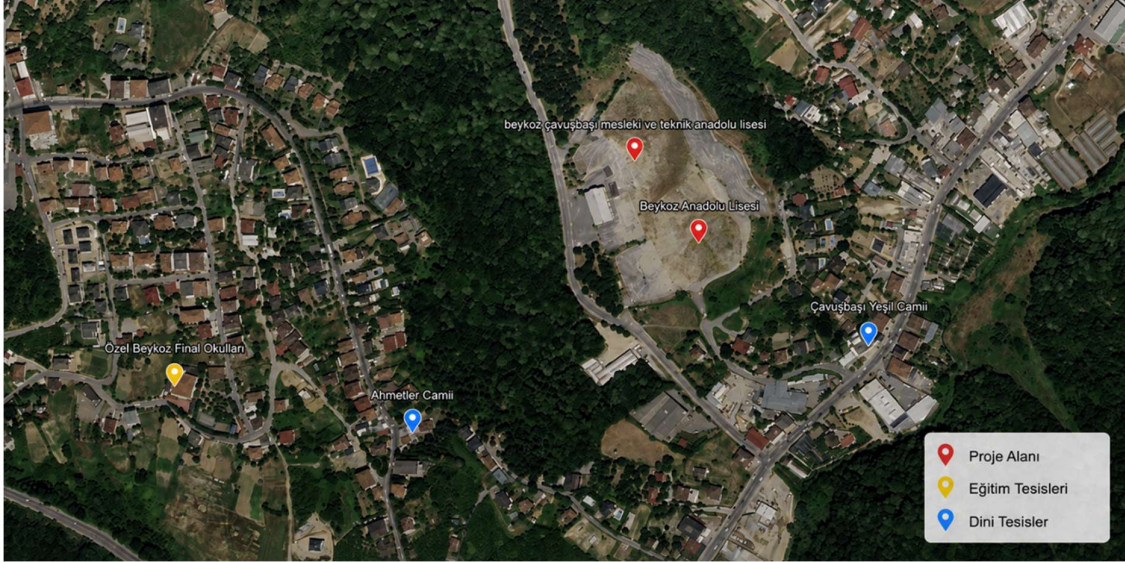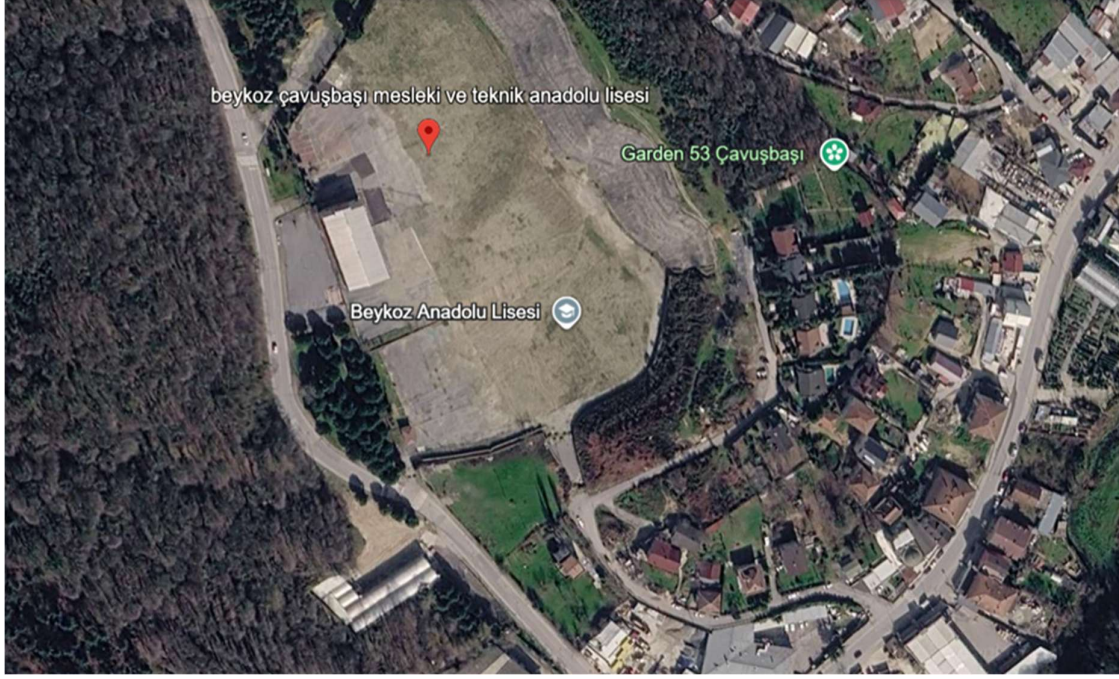

Beykoz Anadolu Lisesi Etki Alanı

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 3. Arazi Kayıt Belgeleri

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)			
Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: 1440/46
Zemin No	: 135266214	Yüzölçüm	: 20.777,49 m2
İl / İlçe	: İSTANBUL/BEYKOZ	Ana Tas. Nitelik	: OKUL VE ARSASI
Kurum Adı	: Beykoz TM		
Mahalle / Köy Adı	: ÇENGELDERE Mah.		
Mevkii	:		
Cilt / Sayfa No	: 22 / 2128		
Kayıt Durum	: Aktif		

TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK

S/Bİ	Açıklama	Malik / Lehdar	Tarih - Yevmiye	Terkin Sebebi - Tarih - Yev
Beyan	ZABIT DEFTERİ 31 CİLT 129 SAYFA 59 SIRA NUMARASINDA KAYITLI 03/07/1947 TARİHLİ ORMAN VASİFELİ 6024 HEKTAR MİKTARLI ALANDAN 6831 SAYILI ORMAN YASASININ 3302 SAYILI YASA İLE DEĞİŞİK 2/B MADDESİ UYARINCA ORMAN KADASTRO KOMİSYONUNCA HAZİNE ADINA ÇIKARILMIŞTIR.		19/01/2000 - 147	--
Beyan	ÜZERİNDE NATAMAM AHMET YASEVİ (FETHİ) KÜLLİYESİ BULUNMAKTADIR.		19/01/2000 - 147	--
Beyan	İSTANBUL 3. NOLU KÜLTÜR VETABİAT VAR.KORUMA KURULUNDA ONAYLANMADAN HİÇBİR UYGULAMANIN YAPILMAMASI TAKBİ MEVCUTTUR. 27/02/2004 Y:818 MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI 22/10/2002 T.45127 S.Y. İLE		27/02/2004 - 818	--
Beyan	HALİME EKEREL VE MİRASCILARI NAZİFE EKEREL, HALİM EKEREL, HALİME EKEREL (EV. LÜTOĞLU) SEBAHAT EKEREL (EVCASI) HALİL İBRAHİM EKEREL FERHAT EKEREL VE ELFİDE EKEREL (EV. SOFU) ZİLİYETLİĞİNDEDİR 23/05/2005 Y:2752		23/05/2005 - 2752	--
Beyan	6831 SAYILI KANUNUN 2/B MADDESİ UYARINCA HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILMIŞTIR.		12/12/2012 - 7339	--
Beyan	Diğer (Konusu: Kusmen Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma Ve Kontrollü Kullanım Alanı) Tarih: 20/05/2021 Sayı: 1380637 (Başlama Tarih:05/07/2021, Bitis Tarih:05/07/2021 - Sure:)	BEYKOZ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ	05/07/2021 - 8985	--
Beyan	Diğer (Konusu: LİSE ALANIDIR) Tarih: - Sayı: -	MALİYE HAZİNESİ	18/02/2025 - 3091	--

MUHDESAT BİLGİLERİ

Sistem No	Tip	Tanım	Tarih - Yevmiye	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
3806843	Diğer	İŞ BU TAŞINMAZ VE ÜZERİNDEKİ 3 KATLI KARGİR BİNA BEYKOZ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ VE BEYKOZ ANADOLULİSESİ OLARAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ FİİLİ KULLANIMINDADIR.	18/02/2025 - 3091	- -


MÜLKİYET BİLGİLERİ						
Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay-Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
865223295	MALİYE HAZİNESİ		TAM	20.777,49	İhtiaz İşlemi (TSM) - 18/02/2025 - 3091 - -	

* Tesis edilen şerhler ve beyanlar salt elektronik ortamda tutulmaktadır.

Raporlayan: tk39057
Fırat ÇAKIR
Kaydına Uygundur.
19.02.2025

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 4. Topoğrafik Araştırma

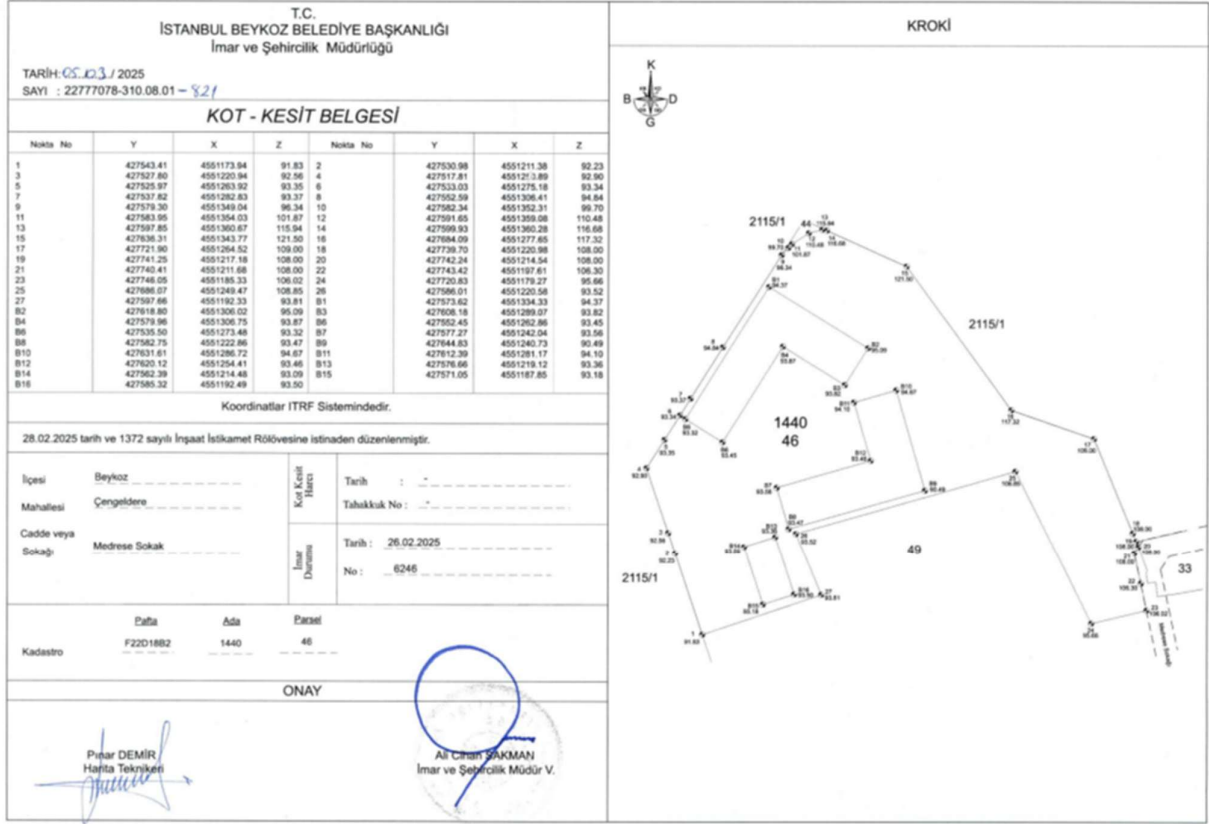

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

T.C																																																																																							
İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI																																																																																							
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü																																																																																							
SAYI: 222777078 -1372		26.12.2025																																																																																					
İNŞAAT İSTİKAMET RÖLÖVESİ																																																																																							
LEJANT ----- Ada Kenarı ----- Plan Fonksiyon ----- Kadastral Sınırı		Koordinatlar ITRF sistemindedir <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nokta No</th> <th>Y</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>427543.41</td><td>4551173.94</td></tr> <tr><td>2</td><td>427530.98</td><td>4551211.38</td></tr> <tr><td>3</td><td>427527.80</td><td>4551220.94</td></tr> <tr><td>4</td><td>427517.81</td><td>4551250.89</td></tr> <tr><td>5</td><td>427525.97</td><td>4551263.92</td></tr> <tr><td>6</td><td>427533.03</td><td>4551275.18</td></tr> <tr><td>7</td><td>427537.82</td><td>4551282.83</td></tr> <tr><td>8</td><td>427552.59</td><td>4551306.41</td></tr> <tr><td>9</td><td>427579.30</td><td>4551349.04</td></tr> <tr><td>10</td><td>427582.34</td><td>4551352.31</td></tr> <tr><td>11</td><td>427583.95</td><td>4551354.03</td></tr> <tr><td>12</td><td>427591.65</td><td>4551359.08</td></tr> <tr><td>13</td><td>427597.85</td><td>4551360.67</td></tr> <tr><td>14</td><td>427599.93</td><td>4551360.28</td></tr> <tr><td>15</td><td>427636.31</td><td>4551343.77</td></tr> <tr><td>16</td><td>427684.09</td><td>4551277.65</td></tr> <tr><td>17</td><td>427721.90</td><td>4551264.52</td></tr> <tr><td>18</td><td>427739.70</td><td>4551220.98</td></tr> <tr><td>19</td><td>427741.25</td><td>4551217.18</td></tr> <tr><td>20</td><td>427742.24</td><td>4551214.54</td></tr> <tr><td>21</td><td>427740.41</td><td>4551211.68</td></tr> <tr><td>22</td><td>427743.42</td><td>4551197.61</td></tr> <tr><td>23</td><td>427746.05</td><td>4551185.33</td></tr> <tr><td>24</td><td>427720.83</td><td>4551179.27</td></tr> <tr><td>25</td><td>427686.07</td><td>4551249.47</td></tr> <tr><td>26</td><td>427586.01</td><td>4551220.58</td></tr> <tr><td>27</td><td>427597.66</td><td>4551192.33</td></tr> </tbody> </table>		Nokta No	Y	X	1	427543.41	4551173.94	2	427530.98	4551211.38	3	427527.80	4551220.94	4	427517.81	4551250.89	5	427525.97	4551263.92	6	427533.03	4551275.18	7	427537.82	4551282.83	8	427552.59	4551306.41	9	427579.30	4551349.04	10	427582.34	4551352.31	11	427583.95	4551354.03	12	427591.65	4551359.08	13	427597.85	4551360.67	14	427599.93	4551360.28	15	427636.31	4551343.77	16	427684.09	4551277.65	17	427721.90	4551264.52	18	427739.70	4551220.98	19	427741.25	4551217.18	20	427742.24	4551214.54	21	427740.41	4551211.68	22	427743.42	4551197.61	23	427746.05	4551185.33	24	427720.83	4551179.27	25	427686.07	4551249.47	26	427586.01	4551220.58	27	427597.66	4551192.33
Nokta No	Y	X																																																																																					
1	427543.41	4551173.94																																																																																					
2	427530.98	4551211.38																																																																																					
3	427527.80	4551220.94																																																																																					
4	427517.81	4551250.89																																																																																					
5	427525.97	4551263.92																																																																																					
6	427533.03	4551275.18																																																																																					
7	427537.82	4551282.83																																																																																					
8	427552.59	4551306.41																																																																																					
9	427579.30	4551349.04																																																																																					
10	427582.34	4551352.31																																																																																					
11	427583.95	4551354.03																																																																																					
12	427591.65	4551359.08																																																																																					
13	427597.85	4551360.67																																																																																					
14	427599.93	4551360.28																																																																																					
15	427636.31	4551343.77																																																																																					
16	427684.09	4551277.65																																																																																					
17	427721.90	4551264.52																																																																																					
18	427739.70	4551220.98																																																																																					
19	427741.25	4551217.18																																																																																					
20	427742.24	4551214.54																																																																																					
21	427740.41	4551211.68																																																																																					
22	427743.42	4551197.61																																																																																					
23	427746.05	4551185.33																																																																																					
24	427720.83	4551179.27																																																																																					
25	427686.07	4551249.47																																																																																					
26	427586.01	4551220.58																																																																																					
27	427597.66	4551192.33																																																																																					
Çekme Mesafeleri Merii İmar Planı ve Mevzuat doğrultusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.																																																																																							
26.02.2025 tarih ve 6246 sayılı İmar Durum Belgesine istinaden düzenlenmiştir.																																																																																							
İLÇESİ	BEYKOZ	APLIKASYON KROKİSİNİN	TARİHİ	19.02.2025																																																																																			
MAHALLE	ÇENGELDERE		NOSU	514																																																																																			
PARSEL MALİKLERİ	MALİYE HAZİNESİ	İMAR DURUMUNUN	TARİHİ	26.02.2025																																																																																			
PAFTA	F22D18B2		NOSU	6246																																																																																			
ADA	1440	İMAR PLANININ	TASDİKTARİHİ	04.03.2022-25.05.2022																																																																																			
PARSEL	46		PAFTASI	F22D18B2																																																																																			
YÜZÖLÇÜMÜ	20777.49 m ²		ÖLÇEĞİ	1/1000																																																																																			
 Bedirhan ANLAYAN Harita Teknikeri		 Ahmet AYDIN Emlak ve İstimlak Müdürü																																																																																					

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 6. Paydaş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı için Resmi Bildiri Yazısı

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi

Sayı : IPKB/IRP/2026-
Konu : Beykoz Anadolu Lisesi
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
Paydaş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı

....../....../2026

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Birimimiz tarafından 2006 yılından bu yana İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) yürütülmektedir. Bu süre zarfında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (IPKB), olası bir deprem durumunda kamu yapılarının risklerini azaltmayı hedeflemiş ve Türkiye Hazinesi katkılarıyla projeye dış finansman sağlayarak deprem hazırlık çalışmalarını sürdürmektedir.

Bununla birlikte, günümüzde iklim değişiklikleri ve yaşanan diğer büyük felaketlerden çıkarılan dersler, şehirlerin afet hazırlıklarını daha bütüncül bir yaklaşımla ele alma gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda IPKB, Dünya Bankası ile iş birliği içinde "İstanbul Dirençlilik Projesi (IRP)"ni geliştirerek uluslararası standartlara uygun bir risk azaltma ve dirençlilik çerçevesi sunmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, İstanbul Dirençlilik Projesi'nin "Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ)"nin nasıl uygulanacağına dair bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı, ilgili kurumların katılımlarıyla, 25 Şubat 2025 tarihinde düzenlenmiştir. Bu süreçte IRP kapsamında yeniden yapımı gerçekleştirilecek olan Beykoz Anadolu Lisesi için Paydaş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, 12/08/2026 tarihinde saat 10.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Ağlayan Gelin Sok. No:6 Beykoz/İstanbul adresinde bulunan Celal Aras Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecektir. Beykoz Anadolu Lisesi taslak sahaya-özel Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı www.ipkb.gov.tr web sitemiz üzerinde aşağıdaki bağlantı adresinde tüm taraflarca değerlendirilmek üzere paylaşılmıştır.

<https://www.ipkb.gov.tr/e-kutuphane/cevre-ve-sosyal-dokumanlar/>

Söz konusu toplantıya, Beykoz Anadolu Lisesi çalışanlarının, öğrenci velilerinin ve ilgili muhtarlık aracılığıyla okul çevresinde yaşayan mahalle sakinlerinin katılım sağlaması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, 12/08/2026 tarihinde saat 10.00'da Rüzgarlıbahçe Mah. Ağlayan Gelin Sok. No:6 Beykoz/İstanbul adresinde bulunan Celal Aras Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek "Paydaş Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"na iştirak edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

İlkay RODOPLU
Direktör V.



Kısıklı Mah. Alemdağ Yan Yolu Cad.
No:6 34692 Üsküdar/İSTANBUL

Tel: 0 (216) 505 55 00
Faks: 0 (216) 225 04 85

info@ipkb.gov.tr
www.ipkb.gov.tr

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 7. Paydaş Katılım Toplantısının Kamuoyuna Duyurusu

A. Web Sitesi Duyurusu



B. Instagram Duyurusu



İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 8. Paydaş Katılım ve Bilgilendirme Toplantısı Kayıtları

Paydaş (Grup veya Birey)	İstişare Tarihi	Geri Bildirim Özeti	Proje Uygulama Ekibinin Yanıtı	Takip Eylemi / Sonraki Adımlar
Katılımcı	12.08.2026	Projenin beklenen başlama ve tamamlanma takvimine ilişkin bilgi talep edilmiştir.	Çevresel ve Sosyal (Ç&S) dokümantasyonunun gün sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği açıklanmıştır. Satın alma ve ihale süreçlerinin ardından, yüklenici ile sözleşmenin 3–4 ay içerisinde imzalanmasının hedeflendiği ve öngörülen inşaat süresinin 24 ay olduğu belirtilmiştir.	Ç&S dokümantasyonunun tamamlanması.
Okul Müdürü	12.08.2026	Eski okul binasının yaklaşık dört yıl önce yıkılmasının ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin geçici olarak başka okullarda barındırıldığı sürenin uzamasına ilişkin endişeler dile getirilmiştir. Uygulama takviminin mümkün olduğu ölçüde kısaltılması talep edilmiştir.	İPKB'nin inşaat aşamasında önlenebilir gecikmeleri önlemek amacıyla sıkı kontroller uygulayacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte, inşaat faaliyetlerinin kapsamı dışında kalan idari süreçlerin ilgili makamların sorumluluğunda olduğu da açıklanmıştır.	Uygulama sırasında önlenebilir gecikmeleri önlemek amacıyla inşaat takviminin İPKB tarafından sıkı şekilde izlenmesi.
Okul Müdürü	12.08.2026	Okul bahçesinin büyüklüğüne ilişkin endişeler dile getirilmiş ve açık hava basketbol sahası, oturma alanları ve bir terasın dâhil edilmesi önerilmiştir. Ayrıca, kitap atölyesinin işlevi hakkında açıklama talep edilmiştir.	Belirlenen okul bahçesi alanının yaklaşık 1.500 m ² olduğu açıklanmış ve kitap atölyesinin edebî materyaller için düzenlenmiş bir depolama ve etkinlik alanı olarak hizmet verdiği açıklanmıştır. Tasarım danışmanı tarafından ayrıca	Önerilerin teknik uygulanabilirliğinin tasarım danışmanı tarafından değerlendirilmesi.

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

			alınan önerilerin değerlendirileceği belirtilmiştir.	
Katılımcı	12.08.2026	Okulun planlanan öğrenci kapasitesine ilişkin bilgi talep edilmiştir.	Okulun 24 derslik olarak tasarlandığı açıklanmıştır. Nihai öğrenci kapasitesinin, geçerli Millî Eğitim Bakanlığı standartları ve işletme düzenlemeleri doğrultusunda ilgili eğitim makamları tarafından belirleneceği belirtilmiştir.	—
Katılımcı	12.08.2026	18 araçlık otopark alanı olarak belirlenen alanın tahsisinin yeniden değerlendirilmesi ve bu alanın olası olarak okul bahçesine dâhil edilmesi önerilmiştir.	Tasarım danışmanı, önerinin genel saha düzeni ve işlevsel gereklilikler kapsamında değerlendirileceğini belirtmiştir.	Otopark düzenlemelerinin revize edilmesinin uygulanabilirliğinin tasarım danışmanı tarafından değerlendirilmesi.
Katılımcı	12.08.2026	Aynı saha üzerinde iki okulun bitişik şekilde konumlandırılmasına ilişkin endişeler dile getirilmiştir. Anadolu Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasındaki etkileşimden kaynaklanabilecek sorunlara dikkat çekilmiş ve ayrı giriş ve çıkışların sağlanmasının uygulanabilirliği sorgulanmıştır.	Saha düzeninin ve bina tasarımlarının belirlenen proje gerekliliklerine dayanılarak geliştirildiği açıklanmıştır. Ayrıca, yaklaşık 20.000 m ² büyüklüğündeki sahanın önemli bir bölümünün dik eğimlerden oluştuğu ve bina yerleşimi amacıyla tamamen kullanılmadığı belirtilmiştir.	—
Katılımcı	12.08.2026	Planlanan otopark alanının Beykoz Anadolu Lisesi'ne tahsis edilip edilmeyeceğine ilişkin bilgi talep edilmiştir.	Otopark alanının aynı parsel üzerinde bulunan her iki eğitim kurumuna hizmet veren ortak bir tesis olarak tasarlandığı açıklanmıştır.	—

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Mahalle Muhtarı	12.08.2026	Arazinin özel mülk sahiplerinden zorlu koşullar altında edinildiği belirtilmiş ve okul binalarının parselin sınırlı bir bölümüne sıkıştırılmış gibi görünmesine ilişkin endişe dile getirilmiştir.	20.000 m ² büyüklüğündeki sahanın tamamının yapılaşmaya uygun olmadığı, sahanın yaklaşık üçte birinin eğimli araziden oluştuğu açıklanmıştır. Sahanın yerleşiminin jeoteknik çalışmaların sonuçları ve mevcut saha kısıtları doğrultusunda tasarlandığı belirtilmiştir.	—
Öğrenci	12.08.2026	Sahanın neden iki okul arasında paylaştırıldığı sorulmuş ve daha önce alanın tamamının mevcut okulla ilişkilendirildiği belirtilmiştir.	İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından, sahanın tarihsel olarak birden fazla eğitim birimine (7 yapıya kadar) ev sahipliği yaptığı ve mevcut master planın araziye yapılandırılmış, modern eğitim kampüsleri şeklinde yeniden düzenlediği açıklanmıştır.	—
Öğrenci	12.08.2026	Öğrencilerin müzik faaliyetlerine aktif katılımı dikkate alınarak, müzik odasının alanı ve akustik yalıtım özellikleri hakkında bilgi talep edilmiştir.	Planlanan müzik odasının yaklaşık 50 m ² alana sahip olduğu ve tasarıma uygun akustik yalıtım tedbirlerinin dâhil edildiği açıklanmıştır.	—

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 9. Projeye Özel ÇSYP Sunum Materyalleri

Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Dünya Bankası'nın Bilgi Paylaşımı İlkeleri kapsamında, bu toplantı sırasında ses ve görüntü kaydı alınabileceğini, toplantı katılım listesinde yer alan ad-soyad ve kurum bilgilerinizin toplantının dokümantasyonu ve proje kayıtları amacıyla işleneceğini bildiririz.

Toplantı kapsamında elde edilen bilgiler yalnızca:

- Proje paydaş katılımının kayıt altına alınması,
- Çevresel ve sosyal belge hazırlık süreçlerinin doğrulanması,
- Dünya Bankası'nın şeffaflık ve izleme yükümlülüklerinin karşılanması amaçlarıyla kullanılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Toplantıya katılarak bu bilgilendirme kapsamında verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olursunuz.

IPKB

Beykoz İlçesi Eğitim Yatırımlarımız (İSMEP 2006-2026)

BEYKOZ İLÇESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR	
TOPLAM OKUL SAYISI	47
GÜÇLENDİRME VE ONARIMI TAMAMLANAN OKULLAR	23
GÜÇLENDİRME VE ONARIMI DEVAM EDEN OKULLAR	0
GÜÇLENDİRME VE ONARIMI PROJE AŞAMASINDAKİ OKULLAR	0
YENİDEN YAPIMI TAMAMLANAN OKULLAR	13
YENİDEN YAPIMI DEVAM EDEN OKULLAR	3
YENİDEN YAPIMI İHALE AŞAMASINDAKİ OKULLAR	1
YENİDEN YAPIMI PROJE AŞAMASINDAKİ OKULLAR (A)	6
POTANSİYEL AŞAMASINDAKİ OKULLAR (B)	1
KALAN (A+B)	8

➤ İSMEP kapsamında Beykoz İlçesinde yeniden yapım işgatiyle 205 alan ekli derslik sayılı 411'e okunmaktadır, toplam kapalı alan da 29.766 m²'den 34.789m²'ye yükselmektedir.

➤ Yeni İSMEP kapsamında Beykoz İlçesindeki Güçlendirme ve Onarım işgatiyle toplam 60.963m² alana sahip 453 derslikli 23 okul güvenli hale gelecektir.

➤ Beykoz İlçesinde 3 okulun yeniden yapım işgati devam etmektedir. 1 okulun yeniden yapım ihale aşamasında olup 6 okulun ise yeniden yapım projeleri devam etmektedir. Ayrıca 1 okulda fabrikatle aşamındadır.

IPKB

İSTANBUL VALİLİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

İstanbul Dirençlilik Projesi (IRP)
Beykoz Anadolu Lisesi Yeniden Yapımı
Paydaş Bilgilendirme ve İşgare Toplantısı

WORLD BANK GROUP
IPKB

İSTANBUL VALİLİĞİ

İstanbul Dirençlilik Projesi (IRP)

Dünya Bankası (DB) tarafından finanse edilecek ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (IPKB) tarafından yürütülecektir. Proje, İstanbul'un afet risklerini azaltmayı, üstyapıyı güçlendirmeyi ve iklim değişikliğine dayanıklı çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir.

PROJE HEDEFİ

- Afetlere dayanıklı ve sürdürülebilir yapısal çözümler geliştirmek,
- İstanbul'un sismik ve iklim risklerine karşı dirençliliğini artırmak,
- Toplumun afetlere hasarlık kapasitesini güçlendirmek,
- Afet risklerini azaltarak sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği desteklemek

ODAK NOKTASI

- İstanbul'un afet ve iklim risklerine karşı dirençliliğini artırmak

IPKB

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

Ülke/Bölge : Türkiye / İstanbul
Proje Süresi : 2006 - 2031
Uygulayıcı Kurum : İstanbul Valiliği
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (IPKB)

İstanbul Valiliği altında
Uluslararası kuruluşların kredi /hükümetini kullanan
Projeleri paydaş katılımı ile ilgili konularla işbirliği içinde yürüten bir birimdir.

IPKB

Kredi İçeriği

BİLEŞEN 1
Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Sisteminin Güçlendirilmesi

BİLEŞEN 2
Kritik Binaların ve Tesislerin Dirençliliğinin Artırılması

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

IPKB

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Bileşen 1 Kapsamında Yapılması Planlanan Yatırımlar

Acil Durum Binalarının Dirençli Hale Getirilmesi

İlk Müdahale Ekiplerinin Eğitimi ve Donatılması

Toplum Düzeyinde Acil Durum Hazırlığı

Çevresel ve Sosyal Yönetim Gerekliliği

- Projenin ana faaliyetleri olan inşaat çalışmalarını sırasında;
- Proje alanında ve çevresinde ortaya çıkabilecek olası çevresel ve sosyal etkilerin en aza indirilmesi;
- Ufusal mevzuat ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartlarına (CSS) uyumun sağlanması;
- İş gücü haklarını koruması;
- Toplum sağlığı ve güvenliğinin gözetilmesi;
- Çevresel ve sosyal risklerin etkin ve sistematik şekilde yönetilmesi

amaçları çevresel ve sosyal yönetim süreçlerinin uygulanması gerekmektedir.

- Ulusal ve uluslararası standartlara uygun önleyici ve azaltıcı tedbirler uygulanacak,
- Olası olumsuz etkiler **önlenerek**, önlenemeyen durumlarda kabul edilebilir seviyeye **indirilecektir**,
- Çevresel ve sosyal performans, uygulama süreci boyunca izlenecek ve raporlanacaktır.

Bileşen 2 Kapsamında Yapılması Planlanan Yatırımlar

Kritik Binaların ve Tesislerin Dayanıklılığının Artırılması

İstanbul'un Uzun Vadeli Afet ve İklim Direncinin Güçlendirilmesi

Dünya Bankası Çevre ve Sosyal Standartları (ÇSS)

- Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi
- İşgücü ve Çalışma Koşulları
- Kaynak Verimliliği, Kirliğin Önlenmesi ve Yönetimi
- Toplum Sağlığı ve Güvenliği
- Arazi Edimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar ve Gölülüz Yeniden Yerleşim
- Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Varlıkların Sürdürülebilir Yönetimi
- Hizmetler Hizmet Alan Geleneksel Yerli Topuluklar (Yerli Halklar, Sahra Altı Afrika)
- Kültürel Miras
- Finansal Araçlar
- Paydaş Katılımı ve İstisane

Proje (IRP) Sonuçları

- [illegible]

Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları (ÇSS)

- | | |
|-------|--|
| CS51 | Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi |
| CS52 | İşgücü ve Çalışma Koşulları |
| CS53 | Kaynak Verimliliği, Kirliliğin Önlenmesi ve Yönetimi |
| CS54 | Toplum Sağlığı ve Güvenliği |
| CS510 | Paydaş Katılımı ve İstisare |

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartları

Banka, çevresel ve sosyal prosedürlerin bir parçası olarak tüm projeleri dört sınıflandırmadan birine tabi tutmaktadır: **Yüksek Risk, Önemli Risk, Orta Risk ve Düşük Risk.**

Uygun risk sınıflandırmasını belirlerken Banka şu konuları dikkate alır:

- Projenin türü, yeni, hassasiyet ve ölçeği;
- Potansiyel çevresel ve sosyal risklerin ve etkilerin niteliği ve büyüklüğü;
- Kredi kullanıcının çevre ve sosyal riskleri ve etkileri Çevre ve Sosyal Standartlara tutarı bir şekilde yönetme kapasitesi ve taahhüdü.

IPKB

İPKB Görev ve Sorumlulukları

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

IPKB

Yayınlanan IRP Ç&S Dokümanlar

Paydaş Katılım ve İzleme Toplantılarında Nihai versiyonları oluşturulmuş ve Onaylanmış Çevre ve Sosyal dokümanlar Türkçe ve İngilizce olarak www.ipkb.gov.tr sitesinde 03.05.2025 tarihinde tüm ilgili tarafların erişebilmesi için paylaşılmıştır.

- CSTP ➔ Çevre ve Sosyal Taahhüt Planı
- CSYC ➔ Çevre ve Sosyal Yönetim Çerçevesi
- IYP ➔ İzleme Yönetim Prosedürleri
- PRP ➔ Paydaş Katılım Planı

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

IPKB

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Proje Kapsamındaki Genel Sorumlulukları

İPKB ile yakın koordinasyon içinde çalışarak planlarındaki değişiklikleri yönetmek ve sağlamak, İmarat projelerinde diğer kamu kurumlarının görüşlerini, gereksinimlerini zamanında almak, proje sürecinde kamu kurumları ile düzenli iletişimi sağlamak.

Proje uygulanırken gerekli gerekli bilgi ve dokümantasyonu (İmarat Servisi, Gözetimcilik, Trafik Müdürlüğü vb.) sağlamak.

Paydaşların gelen geri bildirimlerini ve görüşlerini İPKB'ye iletilmesini sağlamak.

Aktif olarak gelişen belediye departmanları ile çalışmak,

Kamu binalarının ve diğer kamu yapılarının aktif olarak kullanılması için çalışmak,

Sistemlerin parçaları bakım ve onarımını yapmak için gerekli olan teknik destek sağlamak.

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

IPKB

Yeniden Yapım Projesi Hakkında

Beşiktaş Anadolu Lisesi yeniden yapım projesi;

Bilgen 2: Kritik Binaların ve Tesislerin Dayanıklılığının Artırılması kapsamında finansman edilecek alt projelerden biri olarak seçilmiştir.

Proje Hedefi

- Okulu en yüksek sismik ve iklim dirençliliği standartlarına göre yeniden inşa etmek
- Abdülhak Hakkâri 72 saat temel koruma planını, bu yapıyı ve ilgili yapıların kendi kendine yeten bir bina olarak tasarlamak
- Aktif müdahale kapasitesinin artırılması ve eğitim kurumlarının sürekliliğinin sağlanması katkıda bulunmak

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

IPKB

BEYKOZ ANADOLU LİSESİ YENİDEN YAPIM İŞİ

İPKB Ç&S YÖNETİM SORUMLULUKLARIMIZ

- (i) Projenin tüm yaşam döngüsü boyunca projeye ilişkin tüm gerekli materyaller, broşürler, Şikâyet Mekanizması (SM) bilgileri ve dokümantasyon (Çevresel ve Sosyal dokümanlar dâhil olmak üzere) tüm paydaşların erişimine açık olacak şekilde İPKB web sayfası üzerinden kamuya açık olarak paylaşılmıştır.
- (ii) Bu taahhüt, Paydaş Katılım Planı (PKP) ve projeye ilişkin diğer dokümanlarda tanımlanan proje standartlarına tam uyum içinde yerine getirilecektir.
- (iii) İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) temel sorumluluğu, söz konusu proje standartlarına tam uyum sağlamak olacak şekilde, bu yeffat ve tutarlı bilgi paylaşım sürecini aktif olarak temin etmek ve sürdürmektir.

İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

IPKB

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

[illegible]

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ TARAMASI - Proje Alanı

PROJE ALANI

Eski yapılar olarak sayılı bina yıkıldığı için alan şu anda boştur.

İnşaat Faaliyeti Başlıca Çevre Riskleri

➤ Projenin başlıca çevresel risklerinin inşaat işleri ile ilgili tipik riskler ve etkiler olması beklenmektedir.

Toprak Kaybı Riski: İnşaat kaynaklı toz ve parçacık maddeler Gürültü Riski: Ağır makine ve araç kaynaklı gürültü yönetimi	Lojistik Riski: Hafifletmiş taşıma faaliyetleri sırasında toz ve çamur taşınması Erozyon Riski: Kazı çalışmaları ve yüzey suyu akışının değişmesi sonucu toprak kayması
Tıraşın Riski: Ekilimden çalışması kaynaklı yapısal hassasiyetli, tıraşın etkileri Atık Yönetimi: Tehlikeli ve tehlikesiz atık üretimi ve bertarafı	Drenaj Sorunları: Sahalardaki geçici su birikimi ve drenaj İş Kazaları: yangın, kimyasal sızıntı veya doğal afet riskleri
Kimyasal Riski: Atık yağ ve solvent dökülme riskleri	Çevre Kazaları: Tehlikeli madde depolama ve bertaraf süreçleri

İNŞAAT PROJESİ KOORDİNASYON GRUBU

Proje Çevresel ve Sosyal Etki Alanı

➤ Proje alanı, Beykoz'da konut, eğitim ve iş faaliyetlerinin sınırlı olduğu yerleşik bir alanda yer almaktadır.



Beykoz Anadolu Lisesi Etki Alanı

IPKB

İnşaat Faaliyeti Başlıca Sosyal ve İşgücü Riskleri

	İnşaat sahasında iş kazaları ve yaralanma riskleri.		Acil durum yönetimi eksiklikleri ve kazalara müdahale kapasitesinin yetersizliği.
	Kısa süreli koruyucu ekipman (KKE) eksiklikleri ve güvenlik önlemlerinin yetersiz uygulanması.		Kadın çalışanların istihdam edilememesi veya ayrımcılık yaşama riski.
	Uzun çalışma saatleri ve çalışan refahının korunamaması.		Kırılgan grupları (engelliler, yaşlılar, göçmenler) doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenmesi.
	Alt yükleniciler ve tedarikler tarafından çocuk işçisi veya zorla çalıştırma ihtimali.		Yerel toplulukların ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyecek güçlü veya kalıcı değişiklikler.
	Çalışan işleri azalma süreçlerinde iş kazalarının artma riski edilebilir.		İşçilerin ve toplulukların proje ile ilgili şikayetlerini iletileceği etkin bir mekanizmanın olmaması.
	İnşaat faaliyetlerinin trafik akışı ve yol güvenliği olumsuz etkilenme ihtimali.		Paydaş çalışmalarını yetersiz olması ve halkın proje sürecine dahil edilememesi.
	Şantiye alanında toz, gürültü ve titreşimden kaynaklı sağlık riskleri.		

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

DB Ç&S Risk Değerlendirmesi

Dünya Bankası saha tarama sonucuna göre Beykoz Anadolu Lisesi Yeniden Yapım Projesi;

- Çevresel Riski **Orta**,
- Sosyal Riski **Orta**,

olarak belirlenmiştir.

IPKB

ÇEVRESEL RİSKLERİN YÖNETİMİ


Taz Kontrolü:

- İnşaat faaliyetleri sırasında oluşabilecek toz emiyanları, özellikle kuru hava koşullarında **sulama** yapılarak kontrol altına alınacaktır.
- Malzeme malıyesi sırasında kamyon kasaları **branda** ile kapatacak; hafriyat veya dolgu malzemelerinin rüzgarla çevreye yayılması engellenecektir.
- Toz oluşturabilecek malzemeler (kum, çakıl, çimento vs.) **kapalı alanlarda depolanacak veya üstü uygun şekilde örtülecektir.**
- Şikâyet mekanizması kapsamında tozla ilgili gelen geri bildirimler hızla değerlendirilerek ek tedbirler uygulanacaktır.

Gürültü Kontrolü:

- Çalışmalar mümkün olduğunca **gündüz** saatlerinde yürütülecektir.
- Ses oluşturan ekipmanların **periyodik bakımları** yapılarak gürültü seviyeleri minimumda tutulacaktır.
- Yüksek gürültülü işler kapsamında yakın mahalleler veya kullanıcılar bilgilendirilecek, **çalışma programı önceden duyurulacaktır.**
- En yakın alıcılardan gürültü üretiliyle ilgili herhangi bir şikâyet alındığında **gürültü ölçümleri** yapılacaktır.

IPKB

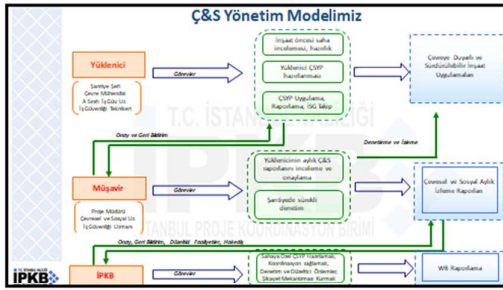

Çevre ve Atık Yönetimi

1. İnşaat esnasında başlıca dikkat edilecek hususlar

- ✓ Taz kontrolü
- ✓ Gürültü kontrolü
- ✓ Toprak kontrolü
- ✓ Trafik ve yaya güvenliği
- ✓ Alışkanlıkların korunması

IPKB

ÇEVRESEL RİSKLERİN YÖNETİMİ

İnşaat çalışmaları sırasında, bölgede halihazırda mevcut olan ulaşım güzergahları, kanalizasyon, elektrik ve su şebekeleri kullanılacaktır.

ATIK YÖNETİMİ

İnşaat & Hafriyat

- Belediyenin belirlediği alanlara taşıyarak depolanır.
- Resmi yazılar ile hafriyat izin ve tapu bilgileri alınır.

Evsel Atıklar

- Kaynağında ayrıştırılır (plastik, cam, kâğıt vs.).
- Geni dönüşüme katılım sağlanır.
- Nispeti Belediyeye birimine teslim edilir.

Ticariyel Atıklar

- Tehlikeli ve kimyasal atıklar işin saha içerisinde "Atık Depo Depolama Alanı" oluşturulur.
- Çevre bilincinin ve bilinçli davranışların artırılması için eğitimler verilir.
- Nispeti Belediyeye birimine teslim edilir.

Atıkların sayımı ve depolanması sırasında, çevre ve insan sağlığı açısından gerekli tedbirler alınacaktır.

IPKB

Çevre ve Atık Yönetimi

2. Atıkların türüne göre ayrı toplanıp depolanması

- ✓ Tehlikeli atıklar
- ✓ Tehlikeli olmayan atıklar (plastik ve geri dönüştürülebilir atıklar)
- ✓ Atık oluşma göre ayrı konteynörler

3. Sahada "Atık Yönetimi Yönetmeliği"ne uygun "Atık Geçici Depolama Alanı" kurulması

- ✓ Geni kapalı, kilitli, ayrı bölümler
- ✓ Çatı suyu tahliyesi
- ✓ Atık alanı temizliği ve ıslahat
- ✓ Bilgiye ulaşma
- ✓ Güvenli ulaşım
- ✓ Kargan korunulması

IPKB

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

[illegible]

YÜKLENİCİ ÇSYP VE EK PLANLARI

- Atık Yönetim Planı
- Toplum Sağlığı ve Güvenliği Planı
- Trafik Yönetimi Planı
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Planı
- Yüklenicinin İş Gücü Yönetim Planı (Proje İYİ ile uyumlu olarak)
- Proje Düzeyinde Paydaş Katılım Planı (Project PKP ile uyumlu olarak)
- Yüklenici Şikâyet Mekanizması (ŞM) Prosedürleri (İşçiler ve topluluklar için)
- Şans Eseri Buluntu Prosedürleri

SOSYAL RİSKLERİN YÖNETİMİ

- Çalışmalar, çevrede yaşayanların günlük hayatını en az etkileyecek şekilde yürütülecek; çalışma saatleri buna göre planlanacaktır.
- Araç giriş-çıkışları için **trafik yönetim planı** uygulanacak; malzeme taşıyan araçların hız ve güzergâhları denetleneyecektir.
- Şantiyedeki tüm çalışanlara **davranış kuralları** (ayırıcılık, SEA/SH vb.) konusunda eğitim verilecek ve bu kurallara uyulması sağlanacaktır.
- Halika düzenli iletişim için **Şikâyet Mekanizması** işletilecek; başvurular kabul edilip alınmış biçimde çözülecektir.
- Proje işlerinin artmasıyla bölgedeki esnafın ekonomik olarak olumlu etkilenebileceği beklenmektedir.
- İşpat alanında **güvenlik, uyum levanlar ve bariyerler** sağlanarak yetkilis kişilerin girişinin önüne geçilecek ve mahalle güvenliği korunacaktır.

**IPKB**

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI



Şikayet Mekanizması ve Kanalları

Projemin sosyal ve çevresel etkilerinden doğan ya da dolayı olarak etkilenen paydaşların endişelerini iletisim@ipkb.gov.tr kayıtlı olarak, 15 günde içinde çözümleyeceğiz.



ŞİKAYET FORMU/E-POSTA

<https://www.ipkb.gov.tr/sikayet-formu/>

info@ipkb.gov.tr





Twitter: <https://x.com/ipkbtr>

Facebook: <https://www.facebook.com/ipkbtr>

Instagram: <https://www.instagram.com/fsm@ipkb/>

LinkedIn: @IPKS

[illegible]

Şikayet Mekanizması Kanalları

- Akış Kapı**
 - İSTANBUL VALİLİĞİ VE İBB
 - Bankalar aracılığı ile yönlendirme
 - Beyaz Masa : 153 Çağrı Merkezi,
 - <https://beyazmasa.obb.gov.tr/>
- Portal**
 - CMER
 - <https://www.cmer.gov.tr>
 - Çağrı Merkezi : 150
- YİMER**
 - Web Sitesi : <http://www.yimer.gov.tr>
 - Çağrı Merkezi : 157

[illegible]

İSTANBUL PROJESİ
İPKB
İSTANBUL PROJESİ KOORDİNASYON BİRİMİ



GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ...

İSTANBUL PROJESİ KOORDİNASYON BİRİMİ





• Kısık Mah. Akademi Yanı Yolu Cad No:13 34055 Üsküdar/İSTANBUL • +90 212 505 55 00
• info@ipkb.gov.tr • www.ipkb.gov.tr • ipkb.gov.tr • [ipkb.gov.tr](http://twitter.com/ipkb) • facebook.com/ipkb • youtube.com/ipkb

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 10. Proje Tasarım Sunumu

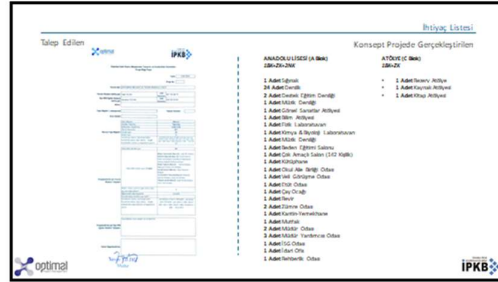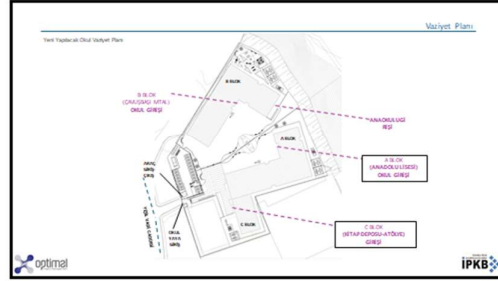

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

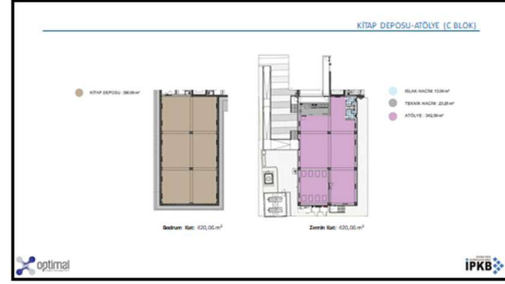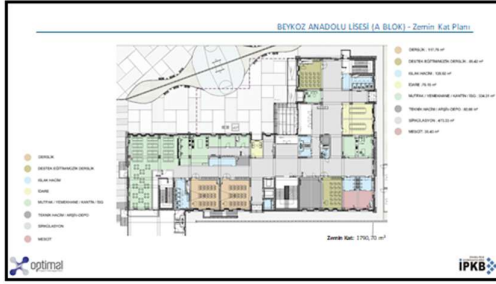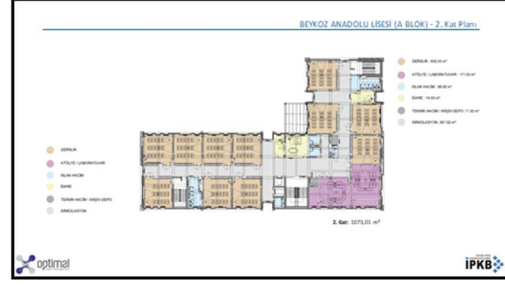

İSTANBUL DİRENÇLİLİK PROJESİ

Ek 11. Paydaş Katılım ve İstişare Toplantısından Fotoğraflar

